



T.C.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI

YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU





MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

1882 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kurulup Mart 1883'te eğitim-öğretime başlayan kurumumuz, 1928'e kadar bu adla, 1928–1982 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi adıyla, 1982-2004 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi adıyla faaliyetini sürdürmüştür. 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5076 sayılı kanunun birinci maddesiyle üniversitemizin adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitemiz 1882 yılına dayanan 134 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında en köklü ve öncü eğitim kurumlarından biridir.

Kurumumuzun 1882'den bu yana yüz yıldan fazla olan eğitim sürecinde sanat hep başat konumda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki çağdaşlaşma düşüncesinin bir ürünü olarak kurulan, kuruluşundan bu yana ülkemizde sanat ve mimarlık alanında pek çok ilke imza atmış olan kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sonrasında da genç cumhuriyetin dinamik yapısına uygun olarak çağdaşlaşma misyonunu kesintisiz olarak sürdürmüş ve öncülük görevini bugünlere taşımıştır.

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmüş olup saydamlık ve hesap verebilirliği temel ilkeleri arasına almıştır. Bu bağlamda hesap verebilirlik gereği olarak ve kaynakların kullanımını denetlemek adına çeşitli raporlamalar yapılması ilgili kanunla hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25.maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan, üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Prof. Yalçın KARAYAĞIZ

REKTÖR

Mart – 2017



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Vizyon

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin vizyonu "çağdaş ve özgün yapısını koruyarak sanatta, tasarımda ve bilimde tüm dünyada tercih edilen öncü bir kurum olmak" tır.

Misyon

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir.

TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

- Amaç 1:** Eğitim-öğretim düzeyinin yükseltilmesi, kurum içi kalite ve motivasyonun artırılması
- Hedef 1.1** Ders müfredatlarının günümüz koşullarına göre güncellenerek farklı eğitim-öğretim modellerinin uygulanması
- Hedef 1.2** Akademik kadro içinde disiplinler arası alanlarda uzmanlaşmanın sağlanması
- Hedef 1.3** Öğrenci kontenjanlarının öğretim elemanı sayısı ve fiziksel koşullarla uyumlu olacak şekilde yeniden iyileştirilmesi
- Hedef 1.4** Öğretim programlarında bilimsel yazım, literatür tarama ve araştırma yöntemleri ile ilgili yılda en az iki kere seminer düzenlemesi
- Hedef1.5** Kurumsal kalite kültürünün iyileştirilmesi
- Hedef 1.6** Üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel paylaşımın artırılması
- Hedef 1.7** Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerin daha verimli ve etkin bir şekilde bilgi teknolojileri kullanımının sağlanması ve yabancı dil ile ilgili bilgi düzeyinin artırılması



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Amaç 2:** Bilimsel ve sanatsal etkinliklerin artırılması ve yayın kalitesinin yükseltilmesi
- Hedef 2.1** Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara yayın ve bildirilerle katılımlarının artırılması
- Hedef 2.2** Öğretim elemanlarının sanatsal etkinliklere eser ve performanslarıyla katılımlarının artırılması
- Hedef 2.3** Öğretim elemanlarının bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının kaynak ayrılarak teşvik edilmesi ve sürdürülmesi
- Hedef 2.4** Bilimsel araştırma projeleri bütçesinin artırılması
- Hedef 2.5** Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını ve destekli proje sayısını artırmaya yönelik iş birliği olanakları yaratmak
- Hedef 2.6** Üniversite yayın sayısı ve niteliğini artıracak olanakların geliştirilmesi
- Hedef 2.7** Öğretim elemanlarının kitapları ve başarılı bulunan lisansüstü tezlerinin yayımlanması
- Hedef 2.8** Tarihi ve kültürel mirasımız olan, ülkemizin ilk Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonumuzun gelecek kuşaklara aktarılması için korunması ve eser sayısının geliştirilmesi
- Hedef 2.9** Sinema mirasının korunması, restorasyonu ve kamuya açılmasına yönelik bilimsel araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi
- Amaç 3:** Ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması
- Hedef 3.1** Bilimsel ve sanatsal alanda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek
- Hedef 3.2** Değişim programları(Erasmus+, Farabi, Mevlana vb.) kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı dolaşımının artırılması
- Hedef 3.3** Lisans ve lisansüstü düzeyde kurumlar arası işbirliğinin artırılması
- Hedef 3.4** Öğrencilere eğitim ve öğretimleri sırasında staj ve mesleki uygulama olanakları sunacak ve mezuniyetleri sonrasında seçecekleri çalışma alanları ile ilgili bilgilendirecek bir kariyer merkezinin geliştirilmesi
- Hedef 3.5** Halkla ilişkiler biriminin geliştirilmesi



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Hedef 3.6 Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

Hedef 3.7 Döner sermaye hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedef 3.8 Üniversite mezunları ile ilgili veri tabanı oluşturulması ve iletişimin artırılması

Amaç 4: Fiziksel alt yapının geliştirilmesi

Hedef 4.1 Fiziksel alt yapının geliştirilmesi

Hedef 4.2 Araştırma ve bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere laboratuvar, araştırma merkezi konser salonu ile atölyelerin kurulması ve mevcut laboratuvar, araştırma merkezi ve atölyelerin geliştirilmesi

Hedef 4.3 Merkez kütüphanenin mekan, eleman ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesi. Kütüphanede yer alan kitap, süreli yayın sayısı ve elektronik veri tabanı üyelik adedinin düzenli bir şekilde artırılması

Hedef 4.4 Üniversitemiz kütüphanesinde görsel ve işitsel bir dokümantasyon merkezi materyal birimi oluşturulması, nadir eserler bölümünde yer alan yayınların restorasyonunun sağlanması ve eserlerin sayısal ortama aktarılması

Hedef 4.5 Resim Heykel Müzesi inşaatının tamamlanarak ulusal, uluslararası sergi ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanların ivedilikle oluşturulması

Hedef 4.6 Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonumuzun dijital ortamda tüm dünyada sergilenebilmesi için uluslararası network ağının oluşturulması

Hedef 4.7 Bağış ve satın alma yoluyla eser sayısının artırılması

Hedef 4.8 Restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının faaliyete geçirilerek müzemiz koleksiyonu yanı sıra kamuya hizmet vermesinin sağlanması

Hedef 4.9 Sanat ve Tasarım (tekno) Parkının yapılması, hayata geçirilmesi

Hedef 4.10 Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin yeniden düzenlenmesi, gerekli hizmet mekanlarının yapılması; Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde sanatsal etkinliklerin nitelikli bir biçimde artırılması

Hedef 4.11 Öğrencilere yönelik barınma, beslenme, sosyal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ve bu alanlardaki olanakların artırılması

Hedef 4.12 Öğrenci veri sisteminin (başvuru, kayıt, notlar, danışmanlık vb) elektronik ortamda yapılması ve tüm belgelerin, kayıtların arşivlenerek sorgulanabilir bir veri tabanı altında toplanması



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Hedef 4.13** Üniversite web sitesinin, üniversitenin özgün karakterini en iyi şekilde yansıtacak, üniversite tanıtımını hem Türkçe hem de İngilizce yapacak, aranan bilgilere en güncel, kapsamlı olarak erişimini sağlayacak bir yapıya getirilmesi
- Hedef 4.14** Ağ ve altyapı projesi ile kablosuz internet erişimi projesinin hayata geçirilmesi, internet bağlantı hız ve kapasitesinin artırılması
- Hedef 4.15** Üniversitemizin koruduğu sinematografik miras ve sinema alanındaki değerli teknolojik yatırım ile fiziksel altyapı koşullarının iyileştirilmesi, sinema mirasının geleceğe ulaştırılması için gerekli fiziksel önlemlerin alınması
- Hedef 4.16** Üniversitemizin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu'nun eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayabilmesi için fiziki alt yapının hazırlanması
- Hedef 4.17** Nusretiye Kasrı restorasyonunun tamamlanarak kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı mekanların oluşturulması

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

Finansman Kaynağı	Eğitim - Yükseköğretim	Eğitim - Kültür	Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor	Toplam
Hazine	14.000.000	23.000.000	200.000	37.200.000
Toplam	14.000.000	23.000.000	200.000	37.200.000



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

Sıra No	Bina Adı	Taşınmazın Bulunduğu Yer			Belediye Adı	Bina Cinsi	Taşınmaz Bilgileri		
		İl	İlçe	Bucak			Açık Alan	Bina Oturum Alanı	Kapalı Alan
1	Güz. Sanatlar Fak. ve Mimarlık Fak.	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Eski eser	19.497	6.370	19.110
2	Fotoğraf Bölümü	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	209	866
3	Oditoryum	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	642	642
4	Heykel Bölümü	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Çelik-Karkas	-	900	1.108
5	Selamlık Köşkü	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	491	943
6	Sıbyan Mektebi	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Eski eser	-	160	320
7	Geleneksel Türk Snt.	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Eski eser	318	106	817
8	Nusretiye Kasrı	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Eski eser	1.950	172	344
9	Tophane-i Amire	İstanbul	Beyoğlu	Tophane	Beyoğlu	Eski eser	10.120	1.855	1.855
10	Konservatuvar	İstanbul	Beşiktaş		Beşiktaş	Eski eser	434	1.883	4.467
11	Resim ve Heykel Müzesi(ICAM) (Antrepo 5)	İstanbul	Beyoğlu	Salıpazarı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	5294	21.177
12	MSGSU Beşiktaş Kampusu	İstanbul	Beşiktaş		Beşiktaş	Betonarme-Karkas	1.116	577	2.885
13	Kiralık Hizmet Binası	İstanbul	Beyoğlu	Salıpazarı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	161	1.127
14	Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema Tv. Araştırma Merkezi	İstanbul	Beşiktaş	Balmumcu	Beşiktaş	Betonarme-Karkas	4.549	4.000	9.710
15	Rektörlük Araştırma Merkezi	İstanbul	Sarıyer	Kısırkaya Köyü	Sarıyer	Betonarme-Karkas	154.500	743	1.009
16	Cihangir Hizmet	İstanbul	Beyoğlu		Beyoğlu	Yığma	-	40	160
17	Sandıkçıoğlu Konağı (Restorasyon Halinde)	İzmir	Ödemiş	Birgi	Birgi	Eski eser	410	170	340
18	Bomonti Kampüs	İstanbul	Şişli	Bomonti	Şişli	Betonarme-Karkas	4.575	2.764	54.000
19	Kız Öğrenci Yurdu	İstanbul	Beşiktaş	Ortaköy	Beşiktaş	Betonarme-Karkas	963	887	4.500
20	İdari Bina	İstanbul	Beyoğlu	Fındıklı	Beyoğlu	Betonarme-Karkas	-	123	1.000



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2016 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin yüzde 37'si amacına uygun olarak kullanılmıştır.

1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2016 yılı bütçesi 134.147.000 TL olup yatırım programı için 37.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yatırım ödeneğinin 13.750.253 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında; eğitim-yükseköğretim sektöründe 6 adet, eğitim-kültür sektöründe 5 adet, eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe 1 adet olmak üzere toplam 12 adet projesi yer almaktadır.

TL


Sektörü	Proje sayısı	Proje tutarı	2015 Yılı Kümülatif Harcama	2016 Yılı Yatırım Ödeneği	2016 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	6	74.900.000	43.550.127	14.000.000	8.145.610
Eğitim/Kültür	5	78.655.000	42.247.922	23.000.000	5.560.929
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1	300.000	10.735	200.000	43.714
TOPLAM	12	153.855.000	85.808.784	37.200.000	13.750.253




MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 Yılı Yatırım Programı Sektörel Dağılımı

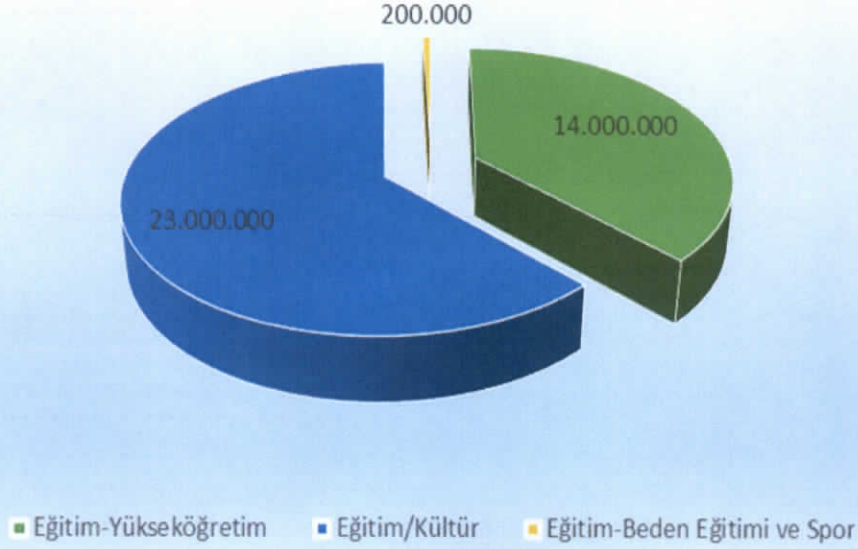

2016 Yılı Yatırım Programı Proje Bazında Dağılımı

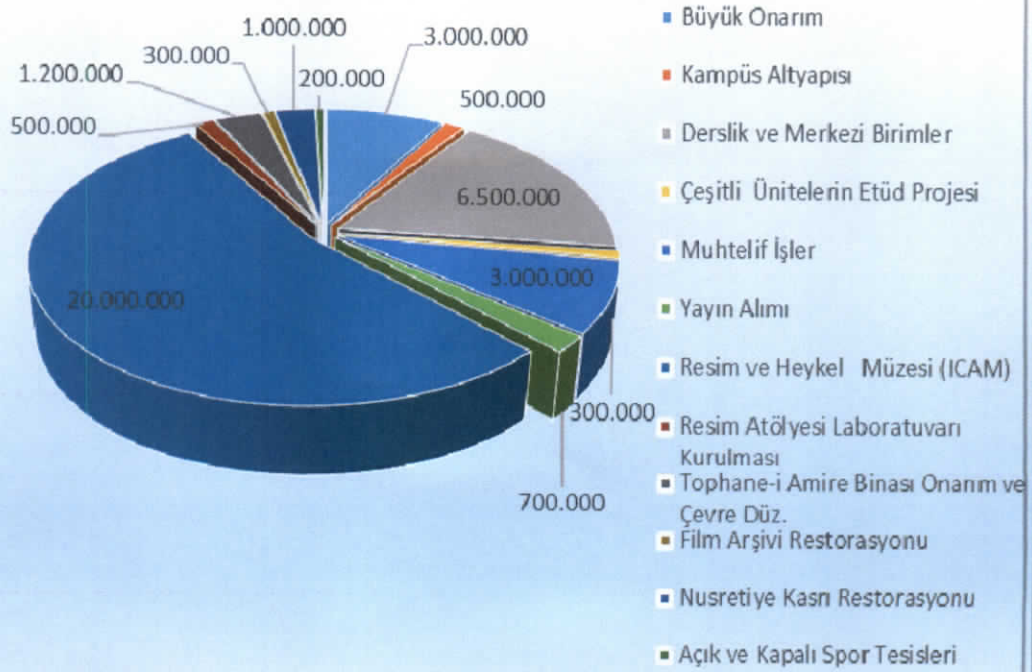



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

02.1 Devam Eden Projeler

PROJE ADI : BÜYÜK ONARIM PROJESİ

PROJE NO : 2007H032800

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde eğitim öğretimin sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların daha işlevsel hale getirilebilmesi için tüm birimlerde ihtiyaç duyulan tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, yerleşke ve bölümlere göre aşağıdaki gibi ayrıntılandırılmıştır.

Merkez Bina

- Mimarlık Fakültesi çatı katı epoksi, boya pvc uygulaması ve muhtelif birimlerde bakım – onarım yapılması işi.
- Güzel Sanatlar Fakültesi sahne dekor, tekstil ve teknoloji atölyelerinde alüminyum doğrama ve cam imalatları yapılması işi.
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Atölyesi yenileme işi ve araştırma merkezinde muhtelif altyapı işleri.
- Muhtelif birimlerde alüminyum doğrama yapılması işi.
- Kantin ve muhtelif birimlerde alüminyum cam yenileme işi ile Tophane- Amire Kültür ve Sanat Merkezinde asansör alt yapı işleri yapılması.
- Muhtelif birimlerinin elektrik dağıtım panolarında kompanzasyon sistemlerinin revize edilmesi.
- Güzel Sanatlar Fakültesi metal, seramik atölyelerinde alçıpen, boya yapılması.

Konservatuvar

- Bale binası çatısında rönevasyon yapılması.
- Tiyatro binası çatısında rönevasyon yapılması ve orta alan demir/sac ızgara yenilenmesi.
- Arka bahçede lambiri (empranyalı – suya dayanıklı) ahşap denk, bölme duvar (çift kapılı akustik paneli) yapılması.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bomonti Kampüsü

- Sıcak su hidrofor değişimi ile arızalı sirkülasyon, pissu pompalarının tamiri, yangın sisteminin dizel grup bakım – onarımlarının yapılması.
- Yağmur iniş borularının malzemeli, işçilikli, sökülüp yenilenmesi.
- telefon santralinde ilave kabin uygulaması yapılması.
- Epoksi kaplama ve tamirati yapılması.
- Bina girişine tente kulübe yapılması.
- Binada yeni mekânlar yaratılması. (alüminyum doğrama + sıva+ parke + cam işleri)

Rektörlük Araştırma Merkezi

- Muhtelif kazı, su kanalı, alt yapı çalışmalarının yapılması.
- Sahil terasında çatı (çelik konstrüksiyon + sandwich) ile otopark alanında çevre düzenlemesi yapılması.
- Bungalov ((28 adet) dış - iç cephelerde boya yapılması, wc ve banyolarında fayansların yenilenmesi ile giriş kapısı revize edilmesi.
- Asma tavan, mermer döşeme, alçıpen bölme, boya işlerinin yapılması.
- Sahil otopark zemin ıslahı (beton işleri) ve çevre düzenlemesi yapılması.
- Platform (çelik konstrüksiyon) yapılması.
- Plaj mutfağının büyütülmesi, güçlendirilmesi, çatı onarımının yapılması ile dış cephenin boardex kaplanıp sıva ve boya yapılması.
- Üst ana bina dış cephe inşaat işleri, çevre temizliği ve tamirat işlerinin yapılması.
- İzolasyon, mantolama, boya, alüminyum doğrama ve çevre düzenleme yapılması.
- Bungalov önlerine (19 adet – 5*10*60 cm ebatlarında) ahşap denk tahtası yapılması.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Giriş kat kolon güçlendirilmesi.
- 2. kat, giriş altı ve giriş katında tadilat, tamirat yapılması.
- Giriş altı katında kolon güçlendirilmesi.
- 2. kat kolon güçlendirilmesi.
- Binada güçlendirme yapmak amaçlı duvar ve zeminde çeşitli işlemlerin (kırılmalar, kesimler) yapılması ve molozların atılması.
- Bahçe duvarına jiletli tel çit yapılması.
- Kalorifer kazanları, kuyu tahliye pompaları ile muhtelif bakım onarım işlerinin yapılması

Ortaköy Kız Yurdu

- Binanın jeneratörüne kablo bağlantısının yapılması.
- Karkas çelik çatı doğrama işleri.
- İlave yeni mahaller yapılması.
- Mevcut çatının projeye göre revize edilmesi.
- Muhtelif doğalgaz tesisatı yenileme, petek ilavesi ile elektrik işlerinin yapılması.

PROJE ADI : KAMPÜS ALTYAPISI

PROJE NO : 2011H034340

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde eğitim öğretimin sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların daha işlevsel hale gelmesi için ihtiyaç duyulan altyapı, yenileme, onarım ve yapım imalatları birçok birimde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

PROJE NO : 2014H030200

Beşiktaş İlçesi 61 pafta 235 ada 15 parselde bulunan Beşiktaş Kampüs inşaatının temel kazı çalışmaları bitirilmiş, kısmi zemin güçlendirmesi yapılarak radye temel imalatları tamamlanmış ve kaba inşaat imalatlarında son aşamaya gelmiştir. İnşaat imalatları sırasında, komşu binaların temellerine bitişik eski bina kalıntılarının kırımının iş makineleri ile yapılamadığından küçük kırıcılarla işler yürütülmüştür. Komşu parsellerdeki binalara ait klima, havalandırma bacaları, elektrik kabloları, demontaj-montaj işlemleri kaba inşaat çalışmalarına engel teşkil etmiştir. Ayrıca zemin güçlendirme imalatları projelerinin teslimi ile ilgili aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı süre kaybı yaşanmış ve gecikme meydana gelmiştir. Projenin 2017 yılı içerisinde ince yapı imalatları yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir.

Yine proje kapsamında bulunan Yüksekokul binası ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmış olup, mevcut binanın yıkılması için ilgili belediyeden yıkım ruhsatı alınamadığından imatlara başlanamamıştır. Proje ile ilgili gerekli izin ve onaylar sonrasında mevcut bina yıkılarak ihalesi yapılacaktır.



Beşiktaş Kampüs İnşaatı



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : RESİM VE HEYKEL MÜZESİ (ICAM)

PROJE NO : 2013H040200

Dolmabahçe Sarayı'nın eklentisi olan Velihaht Dairesi'nde bulunan Resim ve Heykel Müzesi, 2012 yılında Üniversitemize tahsis edilen 5 no'lu Antrepo binasına taşınmıştır. 2013 yılında yatırım programına eklenen "Resim ve Heykel Müzesi" projesi ile yeni Müze binası inşasına başlanmıştır. Projenin etüd-proje ve maket çalışmaları ile Bina güçlendirme işlerine yönelik olarak temel alanı tesviye edilerek temel altı dolgu katmanları imalatı tamamlanmıştır. Güçlendirme projesi kapsamında münferit temeller yeni bir radye temel imal edilerek bütünleştirilmiştir. Tüm kolonlar zemin kat, 1.kat ve 2.katta betonarme mantolama yöntemi ile güçlendirilmiştir. Radye temel üstü yükseltilmiş döşeme (70 cm) tamamlanmıştır.



Resim ve Heykel Müzesi – maket çalışması



Resim ve Heykel Müzesi – maket çalışması



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Güçlendirme gereği olarak 3. ve 4.kat döşemeleri, kolonları çoğunlukla kesilerek tamamen alınmış yerine yeni betonarme kolon imalatları tamamlanmıştır.Yeni betonarme kolonlar arası çelik konstruksiyon kirişler ve döşemeler ile tamamlanmaktadır. 1. 2. ve 3.kat döşemelerinin bir kısmında mimari tasarımdan kaynaklanan kesim işleri tamamlanmış olup, projede bulunan binadaki çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Ön binada mevcut durumda depolanmış eserlerin taşınması için ana bina depo alanları betonarme perdeler yapılarak oluşturulmuş bu alandaki fiziki, inşai, elektrik ve mekanik işler ile tüm elektronik işler tamamlanmıştır. Ana depolara bağlı olarak ilave atölyeler ilgili imalatlar tamamlanmıştır.



Resim ve Heykel Müzesi (ICAM), proje kapsamında yapılan çalışmalar



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yeni nesil eser depolama sistemi ve RFID tabanlı takip ve yönetim sistemleri kurularak, eserler için kalıcı depo alanı oluşturulmuştur. Resim heykel müzesi yeni nesil eser depolama sistemi ve RFID tabanlı takip ve yönetim sistemlerinin ek hizmet alanları için gereken imalatlar tamamlanmıştır. Ön bina boşaltılarak, eserlerin ana depoya taşıma işlemleri tamamlanmıştır.




Yeni nesil eser depolama – Resim ve Heykel Müzesi (ICAM)



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ön binanın yıkım işlemleri tamamlanmıştır. MSGSÜ Resim Heykel Müzesi İnşaatı işi yüklenicisi firmanın taahhütlerini zamanında yerine getirmemesi, müze mevhumunu hafife alması kurumumuza hayli zaman kaybettirmiştir. Bu sebeple 07.04.2016 tarihinde yapılan protokolle yüklenici firma ile karşılıklı anlaşma yoluyla iş sonlandırılmış olup, kalan işler yeniden ihale edilmiştir. 07.06.2016 tarihinde işyeri teslimi yapılarak kalan işlerin imalatlarına başlanmıştır. Mimari projede yeni oluşturulacak yan cephe bodrum katlara yönelik fore kazık işleri ile iki kat bodrum imalatında kazı ve hafriyat işleri tamamlanmıştır. Yıkım sonrasında betonarme ön binanın yerine yapılacak olan iki kat bodrum ve çelik konstrüksiyon yapının temelini güçlendirmek amacıyla fore kazık imalatları ile ön sağ cephe ve yol tarafındaki fore kazık imalatları tamamlanmıştır.

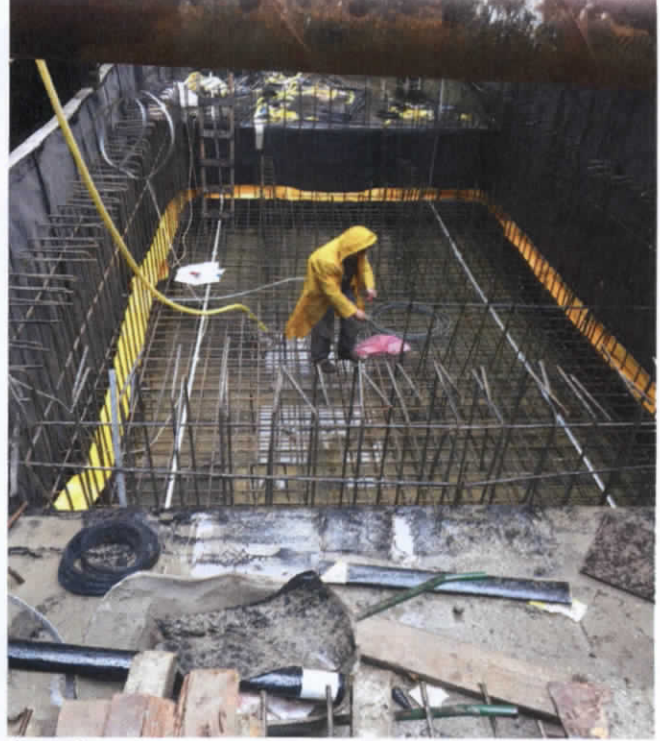

Resim ve Heykel Müzesi (ICAM), proje kapsamında yapılan çalışmalar

Galataport projesi kapsamında, Müze inşaatının komşu parselinde yapılan inşaat yıkım ve zemin altında diyafram perde imalatları sebebiyle inşaat çalışmalarına yaklaşık 2 ay zorunlu ara verildiğinden gecikme meydana gelmiştir. Ön binanın iki katlı bodrum imalatı kazı ve iksa işleri bitirilmiş olup, perde duvar imalatlarına başlanmak üzeredir. Bu arada yapının ince iş ihalesi keşfi hazırlanamakta ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Özetle; Resim Heykel Müzesi İnşaatı'nın genel olarak (1. ve 2. etap işleri toplamı) tamamlanma oranı %59'dir.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : TOPHANE-İ AMİRE BİNASI ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEME

PROJE NO : 2011H040200

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi binasında ihtiyaç duyulan bakım onarım ile muhtelif yeni mekân oluşturma işi devam etmektedir. Proje kapsamında aşağıda yer alan işler yapılmıştır.

- Alt girişe ait duvar işleri, elektrik ve alüminyum doğrama imalatının yapılması.
- İdari birimler binasının kanalizasyon bağlantısının yenilenmesi.
- Alt girişe saç kaplama yapılması.



Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : NUSRETIYE KASRI RESTORASYONU

PROJE NO : 2015H040000

Nusretiye Kasrı'nın restorasyonunun yapılabilmesi ile ilgili olarak, Anıtlar Kurulu'ndan gereken izinler henüz alınamadığından restorasyona başlanamamıştır.



Nusretiye Kasrı



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


PROJE ADI : RESİM RESTORASYON ATÖLYESİ VE LABORATUVARI
KURULMASI

PROJE NO : 2016H040080

Proje kapsamında tablo ve heykel atölyeleri, laboratuvar alanları, paketleme alanı, eser kayıt odası, fotoğraf atölyesi, çerçeve atölyesi, atölyelere yakın depo alanları ile ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak eserlerin kayıt altına alınması ve envanterinin çıkarılması için dokümantasyon sistemi, çevresel koşulları denetlemek üzere iklimlendirme sistemi ve güvenlik sisteminin oluşturulması yer almaktadır.

Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonundaki 11.000 adet eserin 2018 yılında gerçekleştirilecek açılışa kadar, ilk aşamada 1000 adet resim ve 200 adet heykelin bakım, onarım, restorasyon ve konservasyonunun yapılarak sergilenmeye hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Müze koleksiyonunda bulunan 11.000 adet eserin ilk kez envanter kitabının basılarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunulması, uluslararası müzeler network ağının daimi üyesi olarak tüm müze koleksiyonunun dijitalizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Resim ve Heykel Müzesi 1. etap kaba inşaat işlerinin yüzde %80'i tamamlanmış, yeni nesil eser depolama sistemi, RFID tabanlı takip ve yönetim sistemleri kurularak, eserler için kalıcı depo alanı oluşturulmuş, eserlerin ana depoya taşıma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Restorasyon laboratuvarları %65 oranında makina-teçhizatla donatılmış olup fiziki olarak tüm eksiklerine rağmen sistem bu gün itibarı ile çalışmaya hazır durumdadır. Önemli miktarda teknik cihaz, restorasyon için gerekli kimyasal malzemeler, solventler, restorasyon boya ları, araç-gereç ve vakum masası İtalya'dan getirilmiştir.

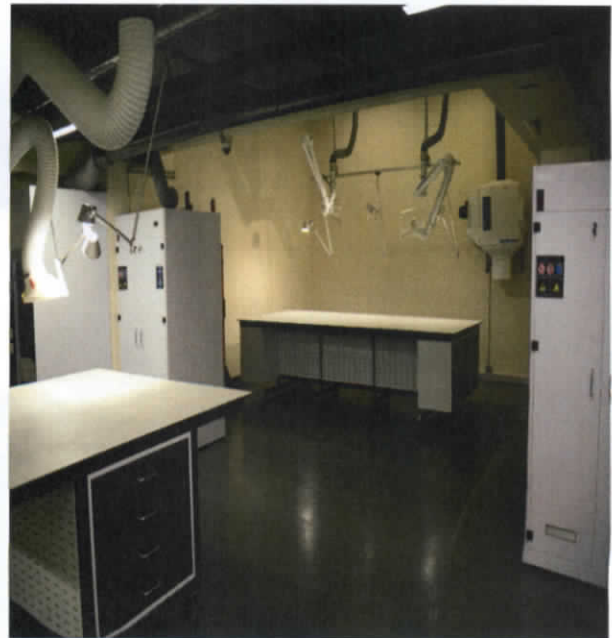

Resim Restorasyon Atölyesi ve Laboratuvarı




MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

**2016 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



Resim Restorasyon Atölyesi ve Laboratuvarı Cihazları- Vakum masası

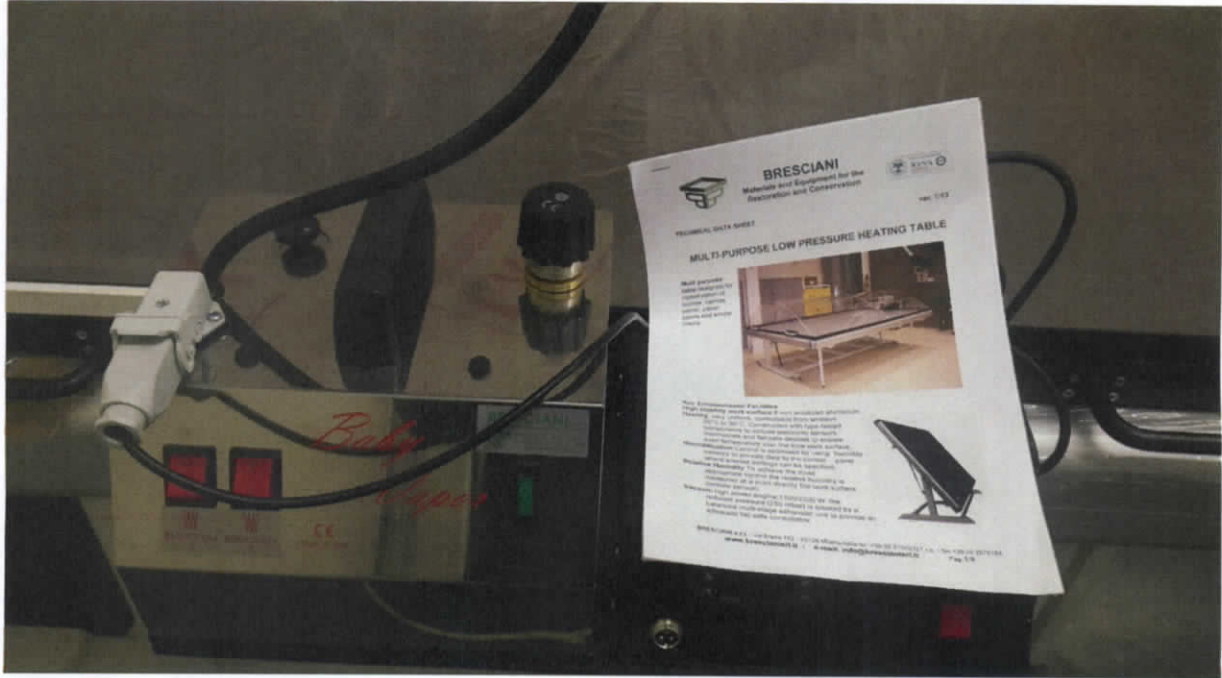

Resim Restorasyon Atölyesi ve Laboratuvarı Cihazları- Vakum masası



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 yılı içerisinde 40 adet resim ve 5 adet heykelin bakım, onarım, restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır. Bunula birlikte Jean-Baptiste Belin'de Fontenay' a ait olabileceği değerlendirilen 6 eserden 1'i kesin olarak tespit edilmiş diğerleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Macar sanatçı Janos Thorma'ya ait de iki adet resim tespit edilmiş olup, 1 adet Rendelmant ve Clement Pujol de Gustavono yanısıra Acquarone'nin bir yapıtı da bu çalışmalar sonucunda anonim olmaktan çıkmıştır.



Restorasyonu yapılan eser, (Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonundan)



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : FİLM ARŞİVİ RESTORASYONU

PROJE NO : 2016H040090

Proje, uzun zaman gerektiren dijital film restorasyonu uygulamalarını uzaktan erişimle yaygınlaştırmayı, Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema TV Merkezi dışındaki kullanıcılara paylaşımını, ülkemizdeki yaygın internet kullanımından yararlanarak filmlerin restore edilmesini ve restorasyon konusunda bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje için ilk olarak 2009 yılından bu yana Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema TV Merkezi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından çok sayıda değerli filmin restore edilmesinde kullanılan dijital film restorasyonu yazılımının uzaktan erişime nasıl açılacağı üzerinde çalışılmıştır. Dijital film restorasyonu yazılım firması ile birlikte yazılımın basitleştirilmiş versiyonunun hazırlanması, yükleneceği internet sitesinin tasarlanması üzerine çalışma ve denemeler yapılmıştır. Eş zamanlı olarak Prof. Sami ŞEKEROĞLU Sinema TV Merkezi'nde kurulması gereken teknik donanım araştırılmış ve veri yönetim sistemine hizmet edecek yüksek kapasiteli bir sunucunun kurulması tamamlanmıştır. Ayrıca Merkezimizde kullanılan restorasyon yazılımları özel ve ileri teknik özelliklere sahip iş istasyonlarında çalıştığından, bu tür cihazlara - doğal olarak - sahip olmayan dış kullanıcıların kişisel bilgisayarlarına yönelik değişiklikler belirlenmiştir.



"Film Arşivi Restorasyonu" projesi kapsamında yapılan çalışmalar



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Diğer yandan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurumunun mevcut veri ağlarını tehlikeye atmayacak, güvenli bir erişim ve veri alışverişi altyapısı üzerinde çalışılmıştır. Dış kullanıcılarla restorasyon amaçlı paylaşılması düşünülen filmin işlenmesi için bir dijital restorasyon sunucusu ile dış kullanıcıların filmi kendi bilgisayarlarına yükleyebilmek için ulaşacağı bir web sunucusunun bağlantıları yapılmıştır. Bu aşamada Merkezimizde bulunan cihazlardan birer prototip olarak yararlanılmış ve sunucu sistemleri denenmeye başlanmıştır. Sene boyunca dış kullanıcıların sahip olabileceği teknik imkanlar düşünülerek geliştirilen restorasyon yazılımı sonuçta dizüstü bilgisayarlara yüklenmiş ve tüm sistem yazılıma erişmek ve restorasyon yapmak isteyen bir dış kullanıcı gibi davranılarak denenmeye başlanmıştır. Proje çalışmalarına 2017 yılında devam edilecek ve sistem tam anlamıyla çalıştırıldıktan sonra kullanıma açılacaktır.

PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

PROJE NO : 2014H050180

Kamuya ait arazi veya spor tesisinin tahsisi yapıldıktan sonra proje ve ruhsat işlemleri tamamlanarak ihale sürecine geçilecektir. Proje kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda malzeme alımı yapılmıştır.

02.2 Tamamlanan Projeler

PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

PROJE NO : 2016H034160

Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için proje, zemin etüt, beton testleri, denetim gibi hizmetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2016 yılı içinde yapılmış etüd projeler aşağıda yer almaktadır;

- Beşiktaş Kampüs inşaatı temel altı kazık projesi ve hesap raporunun hazırlanması.
- Beşiktaş Kampüsü uygulama proje çizimi.
- İzmir Sandıkoğlu Konağı elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması.
- Yüksekokul binası (138 pafta 44 ada 29 parsel) yapımı için zemin etüd raporu hazırlanması hizmet alımı.
- Yüksekokul binası (138 pafta 44 ada 29 parsel) yapımı için uygulama projesi çizimi.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER

PROJE NO : 2016H034170

Üniversitemizin tüm birimlerinin ilgili yıl için gereksinim duydukları makine ve teçhizat ihtiyacı karşılanmıştır. Buna ilaveten mevcut donanımların kapasiteleri artırılmış; yeni geliştirilen uygulamalar ile altyapı eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmış ve yenileme çalışmalarının yapılmasına yönelik adımlar atılmıştır.

PROJE ADI : YAYIN ALIMI

PROJE NO : 2016H034180

Kullanıcılarımızın her geçen gün artan ve çeşitlenen bilgi ihtiyaçları, bilgi teknolojileri ve ürünlerindeki gelişmeler takip edilerek gerek satın alma gerekse abone olma yoluyla sağlanan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılmıştır.

Bu amaçla 2016 yılı mevcut bütçemiz ile akademik birimlerimizin istekleri doğrultusunda 1.001 adet basılı kitap ile 299 adet elektronik kitap satın alınmış, 303 adet yerli ve yabancı basılı süreli yayın ile 28 adet veri tabanı, web keşif aracı SUMMON, elektronik dergi tarama arayüzü 360 CORE ve makale atıf yönetim aracı Refworks FLOW'a abone olunmuştur.

Satın alınan kitaplar ile abone olunan süreli yayınlar ilgili kütüphanelere ulaştırılmıştır. Abone olunan veri tabanları ile SUMMON, 360 CORE ve Refworks FLOW Üniversitemiz yerleşkesi dahilinde IP tanımlı olarak web sayfamız üzerinden tüm kullanıcılarımızın erişimine sunulmuştur.

Üniversitemiz kullanıcıları Proxy üzerinden elektronik bilgi kaynaklarına zaman ve mekân sınırlaması olmadan 7/24 erişim sağlayabilmektedir.



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YILI PROJE HARCAMALARI

1.000 TL

S. NO	SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	BAŞLAMA /BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	2016 YILI YATIRIMI	2016 YILI HARCAMA
1	Eğitim-Yükseköğretim	2007H032800	Büyük Onarım	İst.	2007/2018	43.000	3.000	1.942
2	Eğitim-Yükseköğretim	2011H034340	Kampüs Altyapısı	İst.	2011/2018	15.900	500	0
3	Eğitim-Yükseköğretim	2014H030200	Derslik ve Merkezi Birimler	İst.	2014/2018	12.000	6.500	3.714
4	Eğitim-Yükseköğretim	2016H034160	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İst.	2016/2016	300	300	170
5	Eğitim-Yükseköğretim	2016H034170	Muhtelif İşler	İst.	2016/2016	3.000	3.000	1.622
6	Eğitim-Yükseköğretim	2016H034180	Yayın Alımı	İst.	2016/2016	700	700	698
7	Eğitim-Kültür	2013H040200	Resim ve Heykel Müzesi (ICAM)	İst.	2013/2017	70.000	20.000	4.637
8	Eğitim-Kültür	2011H040200	Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz.	İst.	2011/2017	3.155	1.200	190
9	Eğitim-Kültür	2015H040000	Nusretiye Kasrı Restorasyonu	İst.	2015/2017	4.000	1.000	0
10	Eğitim-Kültür	2016H040080	Resim Atölyesi Laboratuvarı Kurulması	İst.	2016/2017	1.000	500	434
11	Eğitim-Kültür	2016H040090	Film Arşivi Restorasyonu	İst.	2016/2017	500	300	299
12	Eğitim-Beden Eğitim ve Spor	2014H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İst.	2014/2017	300	200	44
GENEL TOPLAM						153.855	37.200	13.750



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- Kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
- İhale mevzuatını uygulamada yaşanan sorunların yanı sıra yaklaşık maliyet hesabının yapılması için teknik personel altyapısının yetersiz olması sorunu yaşanmaktadır.
- Onarım işlerinde maliyetin tam olarak belirlenebilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
- Üniversitemizce hazırlanan Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak programın onaylanmaması da yapılan plan ve programları aksatmaktadır.

Öneriler

- Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belirli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi.
- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara eğitim desteğinin sağlanması.
- Kurumlarca; üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.

Kuruluş Adı : MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Sektör Adı : Eğitim

2016 IV.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nak																
Sektör Adı	: Eğitim															
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)	2015 Kümülatif Harc. (10)	Ödenek Dış Kredİ (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek +/- (14)	Aktar ma Mikt. (15)	Harcam a Dış Kredİ (16)	Harca ma Dış Özkay nak (17)	Harcama Toplam (18)
266530	462	2007H032800	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2018	İstanbul		43.000	33.755			3.000				1.942
266533	462	2011H034340	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2018	İstanbul		15.900	9.665			500				0
265191	462	2011H040200	Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düz.	Özel Bütçe	2017	İstanbul		3.155	1.954			1.200				190
265185	462	2013H040200	Resim ve Heykel Müzesi (İCAM)	Özel Bütçe	2017	İstanbul		70.000	40.293			20.000				4.638
267864	462	2014H030200	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2018	İstanbul		12.000	131			6.500				3.713
247527	462	2014H050180	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2017	İstanbul		300	11			200				44
265188	462	2015H040000	Nusretiye Kasrı Restorasyonu	Özel Bütçe	2017	İstanbul		4.000	0			1.000				0
247434	462	2016H034160	Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi	Özel Bütçe	2016	İstanbul		300	0			300				170
247455	462	2016H034170	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2016	İstanbul		3.000	0			3.000				1.622
247479	462	2016H034180	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	İstanbul		700	0			700				698
265194	462	2016H040080	Resim Atolyesi Laboratuvarı Kurulması	Özel Bütçe	2017	İstanbul		1.000				500				434
265197	462	2016H040090	Film Arşivi Restorasyonu	Özel Bütçe	2017	Muhtelif		500				300				299
GENEL TOPLAM								153.855	85.809			37.200				13.750

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL (Aralık Sonu)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Eğitim	12		153.855			85.809			37.200						13.750
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	12		153.855			85.809			37.200						13.750
