


2023

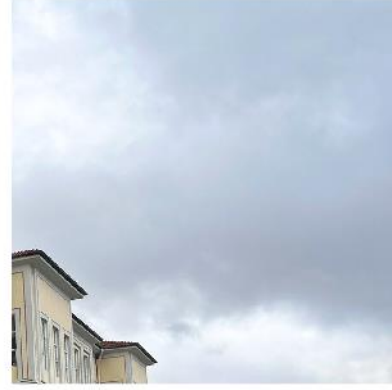

MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ

1882

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İçindekiler

TABLO DİZİNİ	ii
SUNUŞ.....	1
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	3
1.3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme	5
1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	7
2.1. Devam Eden Projeler.....	7
2.1.1. 2023 H 03 – 212546 Büyük Onarım	7
2.1.2. 2023 H 03 - 192309 Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi.....	8
2.1.3. 2011 H 04 – 1428 Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi	9
2.1.4. 2020 H 04 – 160840 Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesi	10
2.1.5. 2022 H 04 – 187892 Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesi	11
2.1.6. 2022 H 04 – 187893 Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi	12
2.1.7. 2023 H 04 – 196672 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi	14
2.1.8. 2023 H 04 – 193161 Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi	15
2.2. Tamamlanan Projeler	17
2.2.1. 2020 H 03 - 151851 Kampüs Altyapısı Projesi.....	17
2.2.2. 2023 H 03 - 212540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	18
2.2.3. 2023 H 03 - 212538 Yayın Alımı Projesi.....	18
2.2.4. 2023 H 03 - 212544 Muhtelif İşler Projesi.....	20
2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	24
2.4. Öneriler.....	24
3. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	25
4. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	26

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2023 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri	2
Tablo 2: Üniversitenin Kullanımında Olan ve Mülkiyet Durumuna Göre Fiziki Alanları (m ²)	4
Tablo 3: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL).....	6
Tablo 4: Büyük Onarım Projesinde Yapılan İşler	7
Tablo 5: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme Projesinde Yapılan İşler	9
Tablo 6: Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinde Yapılan İşler	11
Tablo 7: Kampüs Altyapısı Projesinde Yapılan İşler	17
Tablo 8: Kampüs Altyapısı Projesi Tamamlanma Raporu.....	17
Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan İşler.....	18
Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu.....	18
Tablo 11: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	19
Tablo 12: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	19
Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Harcama Tablosu	20
Tablo 14: Makine - Teçhizat Alımları (TL)	20
Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi - Bakım Onarım Kapsamında Yapılan İşler.....	21
Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	23



SUNUŞ

1882 yılında Mekteb-i Sanâyi-i Nefise-i Şahâne adıyla kurulan Üniversitemiz 142 yıllık geçmişinde Güzel Sanatlar Akademisi (1928), Mimar Sinan Üniversitesi (1982) ve nihayet Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2004) isimleri altında güzel sanatlar, mimarlık, tasarım başta olmak üzere giderek beşerî bilimler alanlarını kapsayan programlarıyla ülkenin marka değeri en yüksek eğitim ve öğretim kurumları arasına girmiştir.

Üniversitemizin hedefi, 4'üncüsü geçtiğimiz yıl kurulan 4 fakültesi, iki Yüksekokulu, bir Meslek Yüksekokulu ve Konservatuarı ile bir yandan ihtisas alanlarında köklü birikime dayanan nitelikli öğretim programlarını sürdürürken bir yandan da çağın ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi bir yaklaşımla alanındaki gelişmeleri yeni programlarla bünyesine katmaktır.

İhtisas alanın sanat, mimarlık ve tasarım olan üniversitemizin en önemli özelliklerinden biri ülkemizin en büyük resim ve heykel koleksiyonundan oluşan bir Müze'ye sahip olmasıdır. İlk adımları 1910'larda atılan, 1937 yılında Atatürk tarafından Akademi'ye tahsis edilen Dolmabahçe Veliâht dairesinde faaliyete geçen Müze'mizin restorasyon ve taşınma süreçleri nedeniyle 2009 yılında kapanan kapıları 2021 Aralık ayı itibarıyla yeniden açmış ve ülkenin en güçlü müzesi olarak bünyesindeki 12 bin civarındaki sanat eserini tematik sergilerle sanatseverlerle buluşturmaya başlamıştır.

Üniversitemize 1982 yılında katılan ve 50 yıllık geçmişiyle alanında önde gelen konservatuarlardan olan İstanbul Devlet Konservatuarı ise güzel sanatlar alanındaki gücümüzü pekiştirmekte ve uyguladığı program ve faaliyetlerle ülkemizin sanat alanında gelişmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Konservatuarımızın eğitim-öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürmesi için Dolmabahçe Sarayı'nın müstemilatı iken uzun yıllar Askeriye tarafından kullanılan binalar 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Üniversitemize tahsis edilmiştir. Yeni mekanına yerleşen Konservatuarımız bu motivasyonla yoğun bir çalışma programı başlatmıştır.

Üniversitemiz bir yandan ihtisas alanlarımızda ülkemize nitelikli insan gücü yetiştirirken bir yandan da Müze'mizde, Konservatuarımızda ve farklı yerleşkelerimizde yıl boyunca hayata geçirdiği çok sayıda sanatsal ve kültürel etkinlikle ihtisas alanlarındaki çıktılarını kamuoyuyla da paylaşarak toplumsal katkı hedefini yerine getirmektedir. Bu amaçla İstanbul'un merkezi konumunda bulunan sergi mekânlarımızda akademik personelimizin ve öğrencilerimizin olduğu kadar STK'ların ve vakıfların sanatsal etkinliklerine de imkânlar sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra, Beşiktaş Yerleşkesinde konumlanan Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki programlarla ve Dolmabahçe'deki Konservatuarımızda sürdürülen yarı zamanlı programlarıyla ihtisas alanlarımıza yönelik eğitimler toplumun geniş kesimlerine de ulaştırılmaktadır.

Üniversitemizin kaynaklarını artırmak ve bunları verimli kullanmak konusundaki çalışmalarımız istikrarlı şekilde devam edecektir. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmekte, saydamlık ve hesap verebilirliği temel ilke olarak kabul etmektedir. Buna göre kaynakların kullanımını denetlemek adına çeşitli raporlamalar yapılması ilgili kanunla hükme bağlanmıştır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesine göre hazırlanan, Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, bu süreçte emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ
Rektör

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alır.

Üniversitemiz, 1882'de Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kurulmuş ve müdürlüğüne arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey getirilmiştir. Resim, heykel, mimarlık ve hakkaklık alanlarında eğitim-öğretim yapması planlanan okulda 2 Mart 1883 tarihinde derslere başlamıştır.

Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksekokulu olan Kurum, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını almış ve böylece Ülkemizde Akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuşmuştur. 4.11.1981'de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını almış, 2004 yılında ise adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak düzenlenmiştir.

1882 yılına dayanan köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında ilk eğitim-öğretim kurumu olan Üniversitemiz Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde öncü kadroları yetiştirdiği gibi, günümüzde de bünyesindeki üç fakülte, üç enstitü, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu ve İstanbul Devlet Konservatuarı ile eğitim-öğretim programları yürütmeyi sürdürmektedir. Ayrıca Üniversitemizde 2022 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu (26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazete) ve 2023 yılında İletişim Fakültesi (04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmî Gazete) kurulmuştur.

Üniversitemizin bünyesinde ayrıca, ülkemizin en büyük sanat eseri koleksiyonu bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Türk sinemasının en geniş film arşivi de yer almaktadır. Üniversitemiz sanat, mimari, tasarım alanlarındaki ihtisaslaşmasına bağlı olarak ülkemizin gerek yetiştirdiği öğrenciler gerek akademik kadrosunun üretimleriyle kültür ortamını beslemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Üniversitemizin vizyonu, sanat, tasarım ve bilimde özgür düşüncüyü, eleştirel yaklaşımı benimsemiş, kültürel mirasına saygılı, evrensel değerlere bağlı bireyler yetiştiren bir kurum olmaktır.

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 85.000.000 TL tutarında olmak üzere toplam 542.212.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2023 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri

Sıra No	Sektör / Alt Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	Proje Bedeli (TL)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)
1	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-12540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	500.000
2	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-12546	Büyük Onarım	13.500.000	3.500.000
3	Eğitim / Yükseköğretim	2020H03-51851	Kampüs Altyapısı	3.300.000	2.000.000
4	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-12538	Yayın Alımı	2.000.000	2.000.000
5	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-12544	Muhtelif İşler	12.000.000	12.000.000
6	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-92309	Fındıklı Ek Eğitim Binası	27.500.000*	15.000.000
7	Eğitim / Kültür	2020H04-60840	Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu	35.500.000	7.000.000
8	Eğitim / Kültür	2011H04-1428	Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	9.500.000	1.000.000
9	Eğitim / Kültür	2022H04-87893	Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi	83.700.000	17.300.000
10	Eğitim / Kültür	2022H04-87892	Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	79.700.000	13.000.000
11	Eğitim / Kültür	2023H04-96672	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	8.000.000	8.000.000
12	Eğitim / Kültür	2023H04-93161	Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	19.500.000*	3.700.000
GENEL TOPLAM				294.700.000	85.000.000

*Proje ödeneği revizyonu sonrasındaki veri işlenmiştir.

2023 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen 11.026.707 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 19.500.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneği ile 250.000 TL şartlı bağış ve yardım kaydı gerçekleştirilerek toplam sermaye giderleri ödeneği 115.776.707 TL tutarına ulaşmıştır. Toplam ödenekten 96.423.347,31 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz,

- Fen-Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- İstanbul Devlet Konservatuvarı
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Meslek Yüksek Okulu

ile ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapmaktadır.

- Fen Bilimleri Enstitüsü,
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

ile lisansüstü programlar yürütmektedir.

Üniversitemizde dil eğitimini geliştirmek ve uluslararasılaşmak politikamıza bağlı olarak bazı programlarımızı yabancı dille de sürdürebilmek amacıyla 2022 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur (26.07.2022 tarih 31904 sayılı Resmî Gazete).

Üniversitemizde görsel tasarımda dijital dönüşümün desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2023 yılında İletişim Fakültesi kurulmuştur (04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmî Gazete).

Bu programlar üniversitenin ihtisas alanı doğrultusunda kurulmuş 21 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırma faaliyetleri ile desteklenmekte ve geliştirilmektedir.

Bunun yanı sıra İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezinde sadece öğretim elemanlarımızın değil, Ülkemizin sanatçılarına da destek olunmakta ve eserlerini sergileme imkânları sağlanmaktadır.



Fındıklı - Merkez Kampüs

Tablo 2: Üniversitenin Kullanımında Olan ve Mülkiyet Durumuna Göre Fiziki Alanları (m²)

Sıra	Birim	Belediye	Taban Alanı	Toplam Kapalı Alan	Mülkiyet ve Tahsis Şekli	Kullanım Amacı	İdari Alanlar	Öğretim Alanları	Sosyal Alanlar		Kapalı Spor Alanı
								Derslik – Laboratuvar-Salon	Kantin/ Yemekhane	Yurt	
1	Fındıklı Yerleşkesi (Cemile Sultan Sarayı)	Beyoğlu	2.530	8.100	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	500	7.600	-	-	-
2	Fotoğraf Bölümü Binası	Beyoğlu	209	866	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	-	866	-	-	-
3	Heykel Ana Sanat Dalı Binası	Beyoğlu	900	1.108	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	180	928	-	-	-
4	Rektörlük Binası (Selamlık)	Beyoğlu	491	943	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	943	-	-	-	-
5	Akademi Kütüphanesi - Kantin-Öğrenci Yemekhanesi	Beyoğlu	950	1.450	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-Sosyal	-	875	575	-	-
6	Fındıklı Yerleşkesi (Münire Sultan Sarayı)	Beyoğlu	2.530	8.600	Milli Emlak	Öğretim	300	8.000	300	-	-
7	Yemekhane	Beyoğlu	871	871	Milli Emlak	Sosyal	-	-	871	-	-
8	Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu	Beyoğlu	642	642	Milli Emlak	Öğretim- Kültür	-	642	-	-	-
9	Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi	Beyoğlu	180	360	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Öğretim- Kültür	180	180	-	-	-
10	Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Binası	Beyoğlu	176	1.496	MSGSU	Öğretim- Kültür	374	1.122	-	-	-
11	Geleneksel Türk Sanatları Binası	Beyoğlu	123	İnşa aşamasında.	MSGSU	Öğretim- Kültür	-	-	-	-	-
12	Tophane Kasrı (Nusretiye Kasrı)	Beyoğlu	172	344	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	150	194	-	-	-
13	Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi	Beyoğlu	1.855	1.855	Milli Emlak	Kültür	100	1.755	-	-	-
14	Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası	Beyoğlu	40	200	Milli Emlak	Öğretim- Kültür	-	200	-	-	-
15	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	Beyoğlu	4.470	28.685	T.D.İ.	Kültür	2.000	24.685	2.000	-	-
16	Süheyl Bey Camii Alt Katı (Kitap Satış)	Beyoğlu	40	40	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Öğretim-Kültür	40	-	-	-	-
17	Beşiktaş Yerleşkesi	Beşiktaş	870	4.350	MSGSU	Öğretim-Kültür	1.895	2.305	150	-	-
18	Baltacılar Dairesi (İstanbul Devlet Konservatuvarı Binası)	Beşiktaş	1.675	3.000	Milli Saraylar	Öğretim-Kültür-İdari	300	2.450	250	-	-
19	Balmumcu Yerleşkesi	Beşiktaş	4.000	9.710	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	600	8.800	310	-	-
20	Dolmabahçe Yerleşkesi	Beşiktaş	3.670	4.818	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	500	4.318	-	-	-
21	Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu	Beşiktaş	970	4.500	Milli Emlak	Sosyal	470	-	500	3.530	-
22	Bomonti Yerleşkesi	Şişli	2.764	54.000	MSGSU	Öğretim-Kültür-İdari	13.320	39.780	1.400	-	500
23	Rektörlük Araştırma ve Uygulama Merkezi	Sarıyer	743	1.009	Milli Emlak	Uygulamalı Öğretim- Sosyal	150	609	250	-	-
24	Birgi Sandıközü Konağı	İzmir/ Birgi	170	340	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Uygulamalı Öğretim- Sosyal	70	-	-	-	-
25	Divriği (Yaz Okulu)	Sivas/ Divriği	-	-	Divriği Kaymakamlığı	Uygulamalı Öğretim- Sosyal	-	-	-	-	-
26	Avşa (Yaz Okulu)	Balıkesir	1.167	-	MSGSU	Uygulamalı Öğretim- Sosyal	-	-	-	-	-
27	Marmara Adası (Yaz Okulu)	Balıkesir	22.340	-	MSGSU	Uygulamalı Öğretim- Sosyal	-	-	-	-	-
28	Büyükdada (Sergi Mekanı)	İstanbul	-	70	MSGSU	Sosyal	70	-	-	-	-
TOPLAM ALAN			54.548	137.357			22.142	105.309	6.606	3.530	500

1.3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Ülkemizin sanat, mimarlık ve kültür alanlarında yükseköğretim yürüten ilk ve en köklü kurumu olarak bu alanlarda en çok tercih edilen üniversitelerin başında gelen üniversitemizde her yıl artış gösteren öğrenci sayısına bağlı olarak derslik, atölye, sergi alanları, çalışma odası ve benzeri ihtiyaçlar da artmaktadır.

Mevcut binalarımızın ülkemizin deprem riskine göre güçlendirilmesi ise 2023 Yılı Yatırım Programında başlıca hedeflerimizden biri olmuştur. Bu nedenle 2023 yatırım projeleri kapsamında üniversitemizin kullanımında olan fiziki alanların depreme dayanıklı hale getirilmesi için güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu açıdan özellikle 2020 yılında yatırım programına alınan Mimarlık Fakültesi Binası (Münire Sultan Sarayı) depreme karşı Güçlendirme ve Restorasyon Projesine 2021 yılında başlanmış ve 2022-2023 eğitim öğretim yılının bahar döneminde kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Aynı şekilde deprem riski raporlanan Balmumcu Yerleşkesinde de bu kapsamda bir çalışma başlatılacağı için bu alanda bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Ulusal Türk Film Arşivi'nin muhafazası amacıyla Bomonti Yerleşkemize taşınması planlanmış ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen bu proje kapsamında Üniversitemiz Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi'ne 2022 yılında 7.000.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarılmıştır. Proje, 2023 yılında Ulusal Türk Film Arşivinin taşınması çalışmaları ile devam etmiştir.



Balmumcu Yerleşkesi

Ayrıca 2023 yılında Beyoğlu ilçesinin Salıpzararı semtinde kiralama yoluyla kullanılmakta iken depreme dayanıklı olmadığı saptanan idari bina boşaltılarak birimlerin çoğunluğu Bomonti Yerleşkesi olmak üzere çeşitli yerleşkelere taşınması sağlanmıştır. Birimlerin nakledildiği mevcut yerleşkelerde Büyük Onarım Projesi kapsamında çalışma ofisleri oluşturulmuştur.

1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

2023 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen 11.026.707 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 19.500.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneği ile 250.000 TL şartlı bağış ve yardım kaydı gerçekleştirilerek toplam sermaye giderleri ödeneği 115.776.707 TL tutarına ulaşmıştır. Toplam ödenekten 96.423.347,31 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre yaklaşık %113, toplam ödeneye göre %83 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 3: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği Aktarımı	Şartlı Bağış ve Yardım	Projeler Arası Aktarım	Toplam Ödenek	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	-	-	-	-	500.000	373.651,10
Büyük Onarım	3.500.000	-	4.000.000	-	-	7.500.000	7.500.000,00
Kampüs Altyapısı	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000,00
Yayın Alımı	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.524.965,12
Muhtelif İşler	12.000.000	640.526	3.000.000	-	1.500.000	17.140.526	16.091.369,68
Fındıklı Ek Eğitim Binası	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	780.000,00
Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu	7.000.000	-	12.500.000	-	1.000.000	20.500.000	20.499.397,44
Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	996.541,30
Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi	17.300.000	10.386.181	-	-	-	27.686.181	27.596.146,19
Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	12.984.811,32
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	8.000.000	-	-	250.000	-	8.250.000	5.644.735,16
Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	3.700.000	-	-	-	- 2.500.000	1.200.000	431.730,00
Toplam	85.000.000	11.026.707	19.500.000	250.000	-	115.776.707	96.423.347,31

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler


2.1.1. 2023 H 03 – 212546 Büyük Onarım

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 13.500.000 TL, program yılı ödeneği ise 3.500.000 TL olan Kampüs Altyapısı Projesine 9.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneği talep edilmiştir. Ancak 4.000.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarılması uygun görülen projede 7.500.000 TL tutarına ulaşan mevcut ödeneğin tamamı harcanmıştır. 2023-2025 yıllarını kapsayan projede fiziki gerçekleşme oranı % 10'dur.

Tablo 4: Büyük Onarım Projesinde Yapılan İşler

Büyük Onarım
Muhtelif Birimlerde Bulunan Klimaların Demontaj-Monta ve Bakım-Onarım İşleri
Merkez Kampüs, Bomonti Kampüsü ve Dolmabahçe Yerleşkesinde Asfaltlama İşleri ile Çeşitli İnşaat İşleri
Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu Islak Hacim Revizyonları ve Muhtelif Yerlerde Onarım İşleri
Ortaköy ve Beşiktaş Binasındaki Duman Dedektörlerinin Yenilenmesi İş
Mimarlık Fakültesi Çatı Katı Dersliklerinde Muhtelif Onarım İşleri
Fındıklı Merkez Kampüsü Mimarlık Fakültesi Kara Tarafı Taş Düzenleme Yapım İş
Fındıklı Merkez Kampüsü Ön Bahçedeki Yağmur Kanallarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Fındıklı Merkez Kampüsü Ön Bahçe Peyzaj Alanı için Küptaş Alımı
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu Girişi ve Fuayesi Muhtelif Düzenleme İşleri
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu Fuaye Alanı Baykuş Cam Pano Tadilat İş
Bomonti ve Fındıklı Merkez Kampüsünde Masa, Bank ve Merdiven Tamirat - Cila İşleri
Çeşitli Birimlerde Muhtelif Cam ve Alüminyum Doğrama İşleri
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Muhtelif Birimlerde Telefon ve Kamera Altyapısı Bakım-Onarım ve Düzenleme İşleri
Fındıklı Yemekhanesi ve Çevre Mahalleri ile Bazı Birimlerde Muhtelif İnşaat İşlerinin Yapılması
Bomonti Yerleşkesi Arşiv Mekânlarının Hazırlanması, Muhtelif Birimlerde Duvar Boya, Sıva ve Elektrik İşleri Yapılması
Bomonti Yerleşkesinde İdari Birimlere Ofis Oluşturulması İş



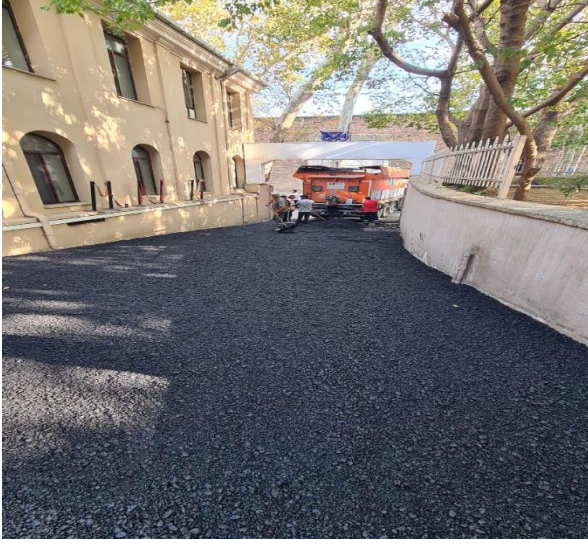

Büyük Onarım Projesinden Çalışmalar

2.1.2. 2023 H 03 - 192309 Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi

Üniversitemize ait, Fındıklı bölgesinde yer alan binanın deprem dayanımının yetersiz olması sebebiyle yıkılarak tekrar inşa edilmesi gerektiği İSTON tarafından yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Bu çerçevede 2023 yılında 15.000.000 TL toplam proje bedeli ile yıllık proje olarak Yatırım Programına alınan Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesinde binanın yıkılarak yeniden yapılması öngörülmüştür.

Öncelikle bina yıkımı tamamlanmıştır. Artan maliyetler nedeniyle iki kez yapım ihalesi iptal olan bu proje için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan süre ve proje tutarı revizyonu talep edilmiştir. Talebin onaylanmasını müteakip yapım için yeniden ihaleye çıkılmış ve 19.09.2023 tarihinde işin yer teslimi yapılmıştır. Projenin 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Revizyon talebinin Cumhurbaşkanınca uygun görülmesiyle 2023-2024 yıllarını kapsayan ve toplam proje bedeli 27.500.000 TL olan projenin 2023 yılı program yılı ödeneği 15.000.000 TL'dir. 2023 yılında yalnızca yıkım giderleri karşılanarak 780.000 TL tutarında harcama yapılmıştır.



Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesinden Çalışmalar

2.1.3. 2011 H 04 – 1428 Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 9.500.000 TL, 2023 yılı program yılı ödeneği ise 1.000.000 TL olan Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesinden 996.541,30 TL tutarında harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleştirme oranı %40, nakdi gerçekleştirme oranı %100'dür.

Tablo 5: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme Projesinde Yapılan İşler

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme Projesi
Tophane-i Amire Okuma Bahçesi Yağmur Oluğu Değişimi, Çatı Onarımı ve Muhtelif İnşaat İşleri
Tophane-i Amire ile Tophane Kasrı Binalarında Muhtelif Elektrik, Mekanik ve İnşaat İşleri



Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenlemesi Projesi




Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenlemesi Projesinden Çalışmalar

2.1.4. 2020 H 04 – 160840 Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesinin toplam proje bedeli 35.500.000 TL, 2023 yılı program yılı ödeneği ise 7.000.000 TL olarak yayınlanmıştır. Yıl içerisinde projeye 12.500.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesinden 1.000.000 TL olmak üzere toplam 13.500.000 TL tutarında ödenek aktarılmıştır.

2023 yılı toplam proje tutarı 76.749.353 TL ve toplam ödeneği 20.500.000 TL tutarına ulaşan projeden 20.499.397,44 TL tutarında harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %100'dür.

Proje kapsamında “Münire Sultan Sarayı (Mimarlık Fakültesi) İnce İşler ve Restorasyon İşlerinin Yapılması” işinin geçici kabul işlemleri tamamlanarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi öncesinde hizmete açılmıştır. Projenin 2024 yılında Münire Sultan Sarayı'nın (Mimarlık Fakültesi) çatı bakım onarımlarının yapılması ile devam etmesi planlanmaktadır.

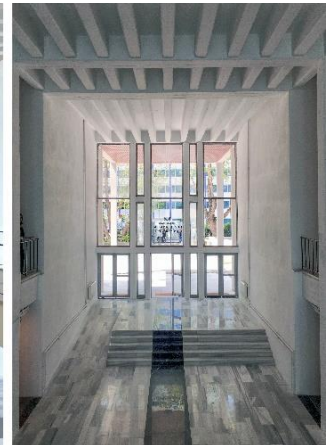

Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesinden Çalışmalar

2.1.5. 2022 H 04 – 187892 Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 79.700.000 TL, 2023 yılı program yılı ödeneği ise 13.000.000 TL olan Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinden 12.984.811,32 TL tutarında harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı %12, nakdi gerçekleşme oranı %100'dür.

Üniversitemize 2021 yılında tahsis edilen Dolmabahçe Yerleşkesinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz döneminden itibaren İstanbul Devlet Konservatuvarı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Tablo 6: Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinde Yapılan İşler

Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu
Dolmabahçe Yerleşkesinde İdari Ofis Oluşturulması İşİ
İstanbul Devlet Konservatuvarı Dolmabahçe Yerleşkesi A ve B Bloklarda İç Dış Boya Yapılması, Bahçe İçinde Bulunan Ek Binalarda Çatı Yenileme ve Muhtelif Onarım İşleri Yapılması
Dolmabahçe Yerleşkesi Öğrenci Yemekhanesi Yapılması
Dolmabahçe Yerleşkesi Tiyatro ve Bale Dersliklerinin Parke Döşenmesi ve Akustik Ses İzolasyonu Yapılması
Konservatuar Dolmabahçe Yerleşkesi Yemekhane Alüminyum Sürgü Sistem Doğrama, Lamine Cam, Elektrik, Data ve Aydınlatma Tesisatları, Bale Bölümü Compact Bölme, PVC Zemin Yapılması ve Muhtelif İnşaat İşleri
Dolmabahçe Yerleşkesi ve Fındıklı Yerleşkesinde Muhtelif PVC ve Alüminyum Doğrama Sineklik İmalatları Yapılması
Dolmabahçe Yerleşkesinde Çelik Yapıdan Tiyatro Sahnesi ve Derslik Yapılması
Dolmabahçe Yerleşkesi ve Muhtelif Birimlerinde Data, Telefon, Kamera Sistemleri Onarım ve Düzenlemeler
Dolmabahçe Yerleşkesinde Hizmet Birimleri (Sağlık, Ulaşım vb.) ve Üflemler için Yeni Mahaller Oluşturulması İşİ
Dolmabahçe Yerleşkesi Bale Bölümü ve Yemekhanede Ayna ve Sineklik Yenileme İşİ
Dolmabahçe Yerleşkesinde Sineklik ve Emniyet Kilidi İşleri
Dolmabahçe Yerleşkesinde Bulunan Muhtelif Cam Tadilat İşleri
Dolmabahçe Yerleşkesinde Bulunan Klimaların Bakım Onarım İşleri
Dolmabahçe Üflemler için Çalgılar, Derslikler Akustik Panel Malzeme ve Uygulama İşİ





Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinden Çalışmalar

2.1.6. 2022 H 04 – 187893 Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 83.700.000 TL, 2023 yılı program yılı ödeneği ise 17.300.000 TL olan Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesine 10.386.181 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Üniversitemiz Balmumcu Yerleşkesi binalarında İSTON tarafından yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda, tüm blokların deprem dayanımının yetersiz olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu alanda yeni bir yapı oluşturulması için etüt proje işlerinin, yatırım projesi kapsamında gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi 2022 Yılında Yatırım Programına alınmıştır. 2022 yılında “MSGSÜ Balmumcu Yerleşkesi Binası Proje, Yaklaşık Maliyet ve Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” ihalesi yapılmış olup 2023 yılı içerisinde proje çalışmaları tamamlanmıştır.

Balmumcu Yerleşkesinde bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde arşivlenen ve korunan Türk Sinemasının hafızası olarak nitelenen Film Arşivi koleksiyonunun (*Türk sinemasına ait orijinal negatiflerin yüzde doksanı, dünya sinemasından klasik filmler, reklam-tanıtım filmleri, belgeseller, afişler, senaryolar, fotoğraflar, lobiler, sinema cihazları gibi sinema tarihini aydınlatacak her türlü sinematografik malzeme ve belgelerden oluşan yaklaşık 120 bin kutuluk arşiv ve bir kısmı nitrat tabanlı özel koruma gerektiren binlerce film, bilgi ve belgeler*) uluslararası standartlara uygun geçici bir mekâna kısa sürede taşınması ve bu esnada teknik önlemlerin alınması ile filmlerin uygun şartlarda korunması, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla Üniversitemiz Bomonti Yerleşkesi içinde mekân belirlenerek projelendirme çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında Ulusal Film Arşivinin Korunması ve Yapılandırılması Projesi için destek sözleşmesi imzalanmıştır. Aynı amaçla Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesinin sürdürülebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 25.07.2022 tarih ve E-72887593-602.07.02-14539 sayılı yazısı ile projeye 7.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneği aktarılmış ve Bakım-Onarım ile Makine-Teçhizat karakteristikleri eklenmiştir.

2023 yılında yapılan likit karşılığı ödenek kaydı talebinin uygun bulunması ve Ulusal Film Arşivinin Korunması ve Yapılandırılması Projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce destek tutarının güncellenmesi ile Ulusal Film Arşivinin Bomonti Yerleşkesi içinde geçici bir mekâna kısa sürede taşınması, arşivin taşınması esnasında teknik


önlemlerin alınması ve filmlerin uygun şartlarda korunması için Üniversitemiz Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi Müdürlüğüne ihaleye çıkmıştır.

MSGSÜ Ulusal Film Arşivi İçin Geçici Mekânlar Oluşturulması ve Arşivin Oluşturulan Mekanlara Taşınması ihalesi kapsamında yürütülen işlemler süre uzatımı nedeniyle 2024 yılında tamamlanacaktır. Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesinin bundan sonraki çalışmaları üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

Bütçe uygulamaları sonrasında 2023 yılında toplam ödeneği 27.686.181 TL tutarına ulaşan projeden 27.596.146,19 TL tutarında harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %100'dür.



Balmumcu Film Arşivi

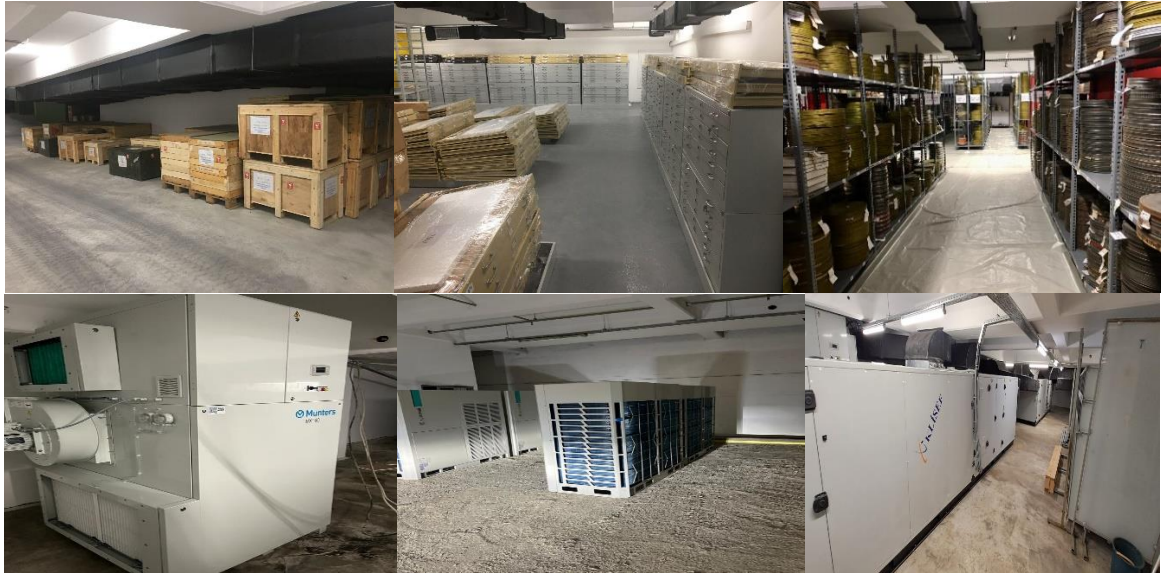

Bomonti Film Arşivi

2.1.7. 2023 H 04 – 196672 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı ile başlayan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi, biri ana proje ile aynı adı taşıyan iki alt projeden oluşmaktadır. Yatırım Programı yayınlandığında toplam proje tutarı ve yılı proje ödeneği 8.000.000 TL olan yıllık projede, Fumigasyon Odası alt projesinin maliyet araştırmalarından sonra süre revizyonu talep edilerek bitiş yılı 2024 olarak revize edilmiştir.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne bilgisayar alınması şartıyla yapılmak istenilen 250.000 TL bağış ve yardımın projeye ödenek kaydedilmesi ile toplam proje ödeneği 8.250.000 TL tutarına ulaşmıştır. Projeden 5.644.735,16 TL tutarında harcama yapılmıştır.

a) 2023 H 04 – 196672 – 196673 Fumigasyon Odası

2023 Yılı Yatırım Programında yıllık proje olarak yer verilen Fumigasyon Odası alt projesinin program yılı ödeneği 7.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğünce yürütülen maliyet araştırmalarının ardından kur dalgalanmaları dolayısıyla alt proje ödeneğinin maliyeti karşılamayacağı ortaya çıkmış ve projede süre uzatımına gidilerek maliyet revizyonu yapılması 2024 Yılı Yatırım Programına proje teklifleri çalışmasında gündeme alınmıştır.

Fumigasyon Odası alt projesinden ihale dosyası, projelendirme ve yaklaşık maliyet çalışması için 59.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Alt proje ödeneğinden 5.175.032 TL kadarı aynı projenin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi alt projesine aktarılmıştır. Projeden kalan tutar 2.265.968 TL'dir. 2024 yılı içerisinde güncellenecek maliyet çalışmalarına göre likit karşılığı ödenek kaydı olarak talep edilecektir.

b) 2023 H 04 – 196672 – 196674 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

2023 Yılı Yatırım Programında yıllık proje olarak yer verilen ve ana proje ile aynı adı taşıyan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi alt projesinin program yılı ödeneği 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Yıl içerisinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi binasının çatı katı, teras bölgeleri, sergi salonu, konteyner üstleri, -1. ile -2. katlarında yalıtım işleri, jeneratör alüminyum saç kaplama işleri, binada mevcut olan 10 asansör ve 2 adet jeneratörün periyodik bakım-onarım ve kontrolleri ile yetkili firmalarca yapılan denetimler gereği talep edilen revizyon ve parça yenilemelerinin karşılanması ve yangın denetim raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Fumigasyon Odası alt projesinden toplam 5.175.032 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne bilgisayar alınması şartıyla yapılmak istenilen 250.000 TL bağış ve yardım Cumhurbaşkanına onayına istinaden 06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik koduna kaydedilmiştir.

Bütçe uygulamaları sonucunda alt proje ödeneği toplam 5.925.032 TL tutarına ulaşmış ve bu tutardan 5.585.735,16 TL kadarı harcanmıştır.



İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesinden Çalışmalar

2.1.8. 2023 H 04 – 193161 Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı ile başlayan Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesinin toplam proje tutarı 7.223.000 TL ve 2023 yılı proje ödeneği 3.700.000 TL olarak yayınlanmıştır.

Üniversitemizin Fındıklı Kampüsü içerisinde yer alan tarihi “Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi” için restorasyon projesi çalışmaları yapılmış ve bu doğrultuda toplam proje tutarının revize edilmesi talep edilmiştir. Proje tutarının 19.500.000 TL olarak revize edilmesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli onayların alınmasının ardından ihaleye çıkmıştır. Restorasyon işlerinin 2024 yılında tamamlanması beklenmektedir.

2023 yılı içerisinde projeden 1.000.000 TL tutarında Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesine ile 1.500.000 TL tutarında Muhtelif İşler Projesine (Kesin Hesap) olmak üzere toplam 2.500.000 TL ödenek aktarılmıştır. 2023 yılı ödeneği 1.200.000 TL kalan projeden restorasyon projesi çalışmaları için 431.730 TL tutarında harcama yapılmıştır.



Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2020 H 03 - 151851 Kampüs Altyapısı Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 3.300.000 TL, 2023 yılı program yılı ödeneği ise 2.000.000 TL olan Kampüs Altyapısı Projesinde ödeneğin tamamı harcanarak proje tamamlanmıştır. Fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %100'dür.

Tablo 7: Kampüs Altyapısı Projesinde Yapılan İşler

Kampüs Altyapısı
Bomonti Binasındaki Sirkülasyon Pompası Değişimi ve Dalgıç Pompa Onarım İşleri
Bomonti Binasında Bulunan Asansörlere Ait Parça Değişim İşleri
İdari-Akademik Personel Yemekhanesi Kazanı Bakım Onarım İşleri
Merkez Kampüs İdari ve Akademik Personel Yemek Salonu Muhtelif Düzenleme İşleri
Mimarlık Fakültesi Led Armatürlerin Onarımı İşleri
Muhtelif Birimlerinde Data Altyapısı Bakım Onarım ve Düzenleme İşleri
Muhtelif Birimlerde Fotoselli Kapı Tamiri İle Muhtelif Cam ve Ayna Değişim İşleri
Muhtelif Birimlerinde İnşaat Elektrik Mekanik Tesisat İşleri Yapılması
Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu Yangın Pompası Çekvalf Değişim İşleri
Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu Binasında Bulunan Asansörlere Ait Parça Değişim İşleri
Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi Doğalgaz Sistemi Elektronik Hacim Düzeltici Değişim İşleri
Sahne Dekor Kostüm Bölümünde Yeni Mekânlara Zemin Kaplaması, Mimarlık Fakültesinde Kısmi Çatı Tadilatı ve Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması İşleri

Tablo 8: Kampüs Altyapısı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03 - 151851			2020H03 - 151851		
Proje Adı	Kampüs Altyapısı			Kampüs Altyapısı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Doğalgaz dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı			Doğalgaz dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2020 - 31/12/2023		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		300			3.300	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020		300			1.059	
2021		1.000			2.581	
2022		1.200			1.588	
2023		2.000			2.000	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmetlerini sürdürmekte olan tüm birimlerinde ihtiyaca yönelik muhtelif onarım ve yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde muhtelif onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.					

*: 2023-2025 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi - Deflatör (2023 =1)

2.2.2. 2023 H 03 - 212540 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli ve 2023 yılı program yılı ödeneği 500.000 TL olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinde 373.651,10 TL harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %75'tir.

Bu projede Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için etüt-proje hizmetleri yürütülmüştür.

Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Dolmabahçe Yerleşkesi 85 KW Elektrik Güç Artırımı Proje Müşavirlik ve Düzenleme İşleri
748 Ada 3 Parseldeki Taşınmaza İnşa Edilecek Yapıya Ait Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması
Usta Mektebi Restorasyon Alanı Sınır Belirleme İşİ
Usta Mektebi ve Kilyos Yerleşkelerinin Harita Mühendislik Revizyon İşleri
1493 Ada 2 Parselin Yola Terk ve Yoldan İhdas İşlemleri İçin Haritacılık Hizmeti Alınması İşİ

Tablo 10: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023 H 03 - 212540			2023 H 03 - 212540		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	2023	500			500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2023		374			374	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için etüt-proje hizmetlerinin alınmasını sağlamak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemizin devam eden ve yapılması planlanan yatırımları için yapılan etüt-proje çalışmaları ile önümüzdeki yıllar için altyapı oluşturulmuştur.					

*: 2023-2025 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2023 =1)

2.2.3. 2023 H 03 - 212538 Yayın Alımı Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli ve program yılı ödeneği 2.000.000 TL olan Yayın Alımı Projesinden 1.524.965,12 TL tutarında harcama yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde kütüphanelerimizde basılı kitap/tez/kitap dışı yayın/sürelili yayın sayısı 160.496 adet, elektronik kitap sayısı: 330.500 adet, elektronik dergi sayısı: 84.900 adet, abone olunan veri tabanı 17 adet, EKUAL kapsamında abone veri tabanı 44 adettir.



Fındıklı Akademi Kütüphanesi

Tablo 11: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutarı (TL)
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	18.030,00
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	1.506.935,12
Toplam	1.524.965,12

Tablo 12: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-187089			2023H03-187089		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	2023	2.000			2.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2023		1.525			1.525	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projedeki abone olunan veri tabanları ve basılı yayın alımları ile yaklaşık 12.000 kişilik üniversite mensubu öğretim üyesi ve öğrencisine yönelik olarak akademik bilgi hizmeti sunulurken akademik verimin artırılmasına katkı sağlamak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Abonelik sağlanan veri tabanlarına ilişkin ödemelerin döviz cinsinden olması nedeniyle kurda meydana gelen dalgalanmalar maliyet riski oluşturmaktadır.					

*: 2023-2025 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2023 =1)

2.2.4. 2023 H 03 - 212544 Muhtelif İşler Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli ve program yılı ödeneği 12.000.000 TL olan Muhtelif İşler Projesi; Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir.

Projeye yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Onayı ile 3.000.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı, 640.526 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ve 1.500.000 TL projeler arası ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Bütçe uygulamaları sonucunda toplam ödeneği 17.140.526 TL'ye ulaşan projeden 16.091.369,68 TL tutarında harcama yapılmıştır. Toplam ödeneye göre nakdi gerçekleşme oranı % 94'tür.

Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Harcama Tablosu

Ekonomik Kod	Başlangıç Ödeneği	Eklene	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1 Mamul Mal Alımları	9.473.000	120.000	870.000	8.723.000	7.708.161
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	2.026.000	-	55.400	1.970.600	1.968.639
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım	1.000	5.740.526	-	5.741.526	5.709.787
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	500.000	205.400	-	705.400	704.783
TOPLAM	12.000.000	6.065.926	925.400	17.140.526	16.091.370

Proje kapsamında gerçekleştirilen 06.1 Mamul Mal Alımlarının Makine-Teçhizat karakteristiği kapsamında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde detayı Tablo 14'te gösterilmiştir.

Tablo 14: Makine - Teçhizat Alımları (TL)

Makine - Teçhizat Alımları (TL)	
06.01.10.01 - Büro Mefruşatı Alımları	282.134,80
06.01.10.02 - İşyeri Mefruşatı Alımları	40.297,20
06.01.10.03 - Okul Mefruşatı Alımları	17.705,70
06.01.10.90 - Diğer Mefruşat Alımları	562.530,35
06.01.20.01 - Büro Makinaları Alımları	580.308,90
06.01.20.02 - Bilgisayar Alımları	1.018.788,49
06.01.20.05 - İşyeri Makine Teçhizat Alımları	164.976,00
06.01.20.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları	4.434.375,28
06.01.30.02 - Atölye Gereçleri Alımları	332.634,00
06.01.70.90 - Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri	54.000,00
06.01.80.01 - Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	42.624,00
06.01.80.03 - Bilgisayar Alımları	117.126,00
06.01.80.04 - Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	3.720,00
06.01.80.05 - Donanım Bakım, Onarım ve Destek Giderleri	7.140,00
TOPLAM	7.658.360,72

Projenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri karakteristiği kapsamında 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları ekonomik kodunda toplam 1.968.639,21 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizce kullanılmakta olan yazılımların lisansları sağlanmış, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülen uyum çalışmaları için ihtiyaç duyulan yazılım ile Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum için gerekli dokümanların periyodik olarak hazırlanabilmesi ve sürecin aksamadan devamlılığının sağlanabilmesi için DGRNET yazılımı alınmıştır.

Ayrıca kabinet düzenlemelerinin yapılması, DNS sunucularının yenilenmesi, gerekli görülen yerlerde kablolu/kablosuz internet hizmetinin sağlanması ve yeniden düzenlenmesi, mevcut ve ilave switch düzenlemeleri ile network ve ağ altyapısı çalışmaları yürütülmüştür.

Üniversitemiz ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında Üniversite Bulut Bilişim Sistemi (UBBS) anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile 2023 yılı için bedelsiz olarak Üniversitemize ait 4 adet sanal sunucu UBBS’de kurulmuş ve buradan hizmet vermektedir. Aynı zamanda sunucuların İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezinde günlük periyodik bakımları yapılmaktadır.

Projenin Bakım - Onarım karakteristiği kapsamında 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde başlangıç ödeneği 1.000 TL iz ödenek olarak bulunmakla birlikte 640.526 TL tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiş ve aynı projenin 06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik kodundan 600.000 TL tutarında ödenek aktarılmıştır. Bakım-onarım karakteristiği bütçesi toplam 1.241.526 TL tutarına ulaşmış ve 1.234.588,49 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi - Bakım Onarım Kapsamında Yapılan İşler

Muhtelif İşler Projesi - Bakım Onarım
Fındıklı Binasında Bulunan Asansöre Ait Parça Değişim İşİ
Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi Arşiv Odası Klima Bakım Onarım İşleri
Salıpazarı Binasında Bulunan Asansöre Ait Parça Değişim İşİ
Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu Mekanik Isıtma Sıhhi Tesisat Onarım Yenileme İşleri
Beşiktaş Kampüs Binası Yan Cepheleri İle Asansör Kulesi Boşluğunda Yalıtım İşleri Yapılması
Muhtelif Birimlerinde Bulunan Giriş Kapısı Tadilat Ve Motor Montaj İşleri
Dolmabahçe, Fındıklı Yerleşkesi İle Ortaköy Yurt Binasında Mekanik Bakım Onarım İşleri
Merkez Kampüsünde Bulunan Kazanın Periyodik Bakım İşİ
Bomonti Binasındaki Mekanik Sistemlerin Pompa Onarım İşleri
Bomonti Kampüsünde Bulunan Asansöre Ait Kart Okuyucu Sisteminin Yapılması İşİ
Tophane Kasrı Binasındaki Jeneratörlere Ait Onarım ve Devreye Alma İşİ
Jeneratör Yenileme İşİ

Ayrıca 06.9 Diğer Sermaye Giderlerinde 500.000 TL olan başlangıç ödeneği proje içi ödenek aktarma yoluyla 205.400 TL ödenek aktarılmış ve toplam ödenek 705.400 TL tutarına ulaşmıştır. Projenin 06.9 Diğer Sermaye Giderleri ekonomik kodundan Üniversitemiz taşitlarının bakım onarım giderleri için 704.782,67 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Projenin Kesin Hesap karakteristiğinde başlangıç ödeneği olmamakla birlikte en son 2022 Yılı Yatırım Programında yer verilen Üniversitemiz Tophane Kasrının (Nusretiye Kasrı) restorasyonu amacıyla yürütülmüş olan Nusretiye Kasrı Restorasyonu Projesi için kesin hesap ödemesi yer almaktadır.

2022 yılı sonunda geçici kabul işlemlerine başlanarak 04.04.2023 tarihinde kabul işlemleri tamamlanan Nusretiye Kasrı Restorasyonu Projesinin kesin hesap, artırımlı ve ek fiyat farkı

hesaplanmış ve yükleniciye ödenmesi gereken toplam 4.400.611,95 TL için Muhtelif İşler Projesine 3.000.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği ile Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesinden 1.500.000 TL tutarında ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.



Tophane Kasrı (Nusretiye Kasrı) Restorasyonu Çalışmaları



Tophane Kasrı (Nusretiye Kasrı)

Tablo 16: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2023H03 - 212544			2023H03 - 212544		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		12.000			17.141	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2023 Yılı Fiyatlarıyla*</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		16.091			16.091	

*: 2023-2025 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2023=1)

SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Kamu İhale Mevzuatında öngörülen ihale süreçlerinin uzun olması,
- Üniversitemiz yapım işlerine konu olan yapıların tarihi eser ve kültür varlığı niteliğinde olması nedeniyle inşaat ve onarım maliyetinin hesabında kullanılan unsurların özel uzmanlık gerektirmesi,
- Üniversitemizin şehir merkezinde bulunan yapılarında yatırım faaliyetleri için kullanılan vinç, kamyon, hafriyat aracı vb.nin gün içinde yeterli hareket kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle faaliyetin planlanan sürede yerine getirilememesi,
- Yatırım programında yer alan projelerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla alınması gereken sicil, izin, ruhsat ve benzeri belgelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat ve çalışma koşullarına bağlı olarak projede belirlenen sürede alınmaması,
- Ayrıntılı Finansman Programına göre daha önce üçer aylık dönemler halinde yapılan ödenek serbest bırakma işleminin aylık olarak uygulanması ve program onaylamasının Üniversitemizin hazırladığı Ayrıntılı Finansman Program teklifine uygun olarak yapılmaması, plan ve programlarımızı aksatmaktadır.

2.4. Öneriler

- Elektronik uygulamaların gelişmesi nedeniyle Kamu İhale Mevzuatında öngörülen sürelerin ihale sürecini kısaltacak şekilde düzenlenmesi,
- Üniversitelere ayrılan kadro tahsisi sayısının artırılması ve özellikle teknik personel için daha fazla sayıda kadro tahsis edilmesi,
- Maliyet hesaplama metotlarının bir disiplin altına alınarak sistematik hale getirilmesi,
- Bakım-onarım maliyetlerinin enflasyona bağlı olarak artması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'inci maddesinin (d) fıkrasında belirlenen eşik değer tutarının artırılması,
- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme konusunda yetkinliğinin artırılması ve güncel mevzuata uyum sağlaması için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim desteği sağlanması,
- Merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından üniversitelerin yatırıma yönelik faaliyetlerine dair benzer sistemlerin kullanılması ve raporların hazırlanması istenildiğinden personelin iş yükü artmakta ve hazırlanan raporlar tekrara düşmektedir. Bütünleşik bir sistemin kullanılması ve buna bağlı olarak rapor hazırlanmasının hem raporun niteliğinin hem de sistem kullanımının etkinliğini artıracakı düşünülmektedir.

3. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2023 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam	Geçmiş Yıllar Kümülatif Harcama	Program Yılı Ödeneği	+/-	Aktarma, Ekleme	Harcama
2023H03-212540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2023	İstanbul	500	-	500			374
2023H03-212546	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2025	İstanbul	13.500	-	3.500	+	4.000	7.500
2020H03-151851	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2023	İstanbul	3.300	1.300	2.000			2.000
2023H03-212538	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2023	İstanbul	2.000	-	2.000			1.525
2023H03-212544	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2023	İstanbul	12.000	-	12.000	+	5.141	16.091
2023H03-192309	Fındıklı Ek Eğitim Binası	Özel Bütçe	2024	İstanbul	27.500*	-	15.000			780
2020H04-160840	Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu	Özel Bütçe	2024	İstanbul	35.500	28.500	7.000	+	13.500	20.499
2011H04-1428	Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	Özel Bütçe	2024	İstanbul	9.500	8.000	1.000			997
2022H04-187893	Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi	Özel Bütçe	2025	İstanbul	83.700	5.250	17.300	+	10.386	27.596
2022H04-187892	Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	Özel Bütçe	2025	İstanbul	79.700	950	13.000			12.985
2023H04-196672	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	Özel Bütçe	2024	İstanbul	8.000	-	8.000	+	250	5.645
2023H04-193161	Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	Özel Bütçe	2024	İstanbul	19.500*	-	3.700	-	2.500	432
TOPLAM					294.700	44.000	85.000	+	30.777	96.423

Not: Tablonun oluşturulmasında 2023 Yılı Yatırım Programı ile ilan edilen veriler esas alınmış olup Fındıklı Ek Eğitim Binası ve Sıbyan Mektebi Restorasyonu projelerinde yıl içerisinde gerçekleştirilen proje tutarı revizyonu tabloya işlenmiştir.

4. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	12	-	294.700	-	-	44.000	-	-	85.000	-	-	30.777	-	-	96.423
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
TOPLAM	12	-	294.700	-	-	44.000	-	-	85.000	-	-	30.777	-	-	96.423
