

2025



MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ

1882



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İçindekiler

TABLO DİZİNİ	1
SUNUŞ.....	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	2
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	4
1.3. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme	6
1.4. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	8
2.1. Devam Eden Projeler.....	8
2.1.1. 2011 H 04 – 1428 Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi	8
2.1.2. 2020 H 04 – 160840 Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı Projesi.....	9
2.1.3. 2022 H 04 – 187892 Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesi	11
2.1.4. 2023 H 04 – 196672 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi	12
2.1.5. 2024 H 03 – 232625 Kampüs Altyapısı Projesi	16
2.1.6. 2024 H 04 – 234804 Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları	16
2.1.7. 2025 H 03 – 259560 Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi Projesi	18
2.2. Tamamlanan Projeler	19
2.2.1. 2025 H 03 – 259224 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	19
2.2.2. 2025 H 03 – 259222 Yayın Alımı Projesi	20
2.2.3. 2025 H 03 – 259279 Muhtelif İşler Projesi	22
2.2.4. 2023 H 03 – 212546 Büyük Onarım Projesi	26
2.2.5. 2023 H 03 – 192309 Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi.....	28
2.2.6. 2023 H 04 – 193161 Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi	30
2.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	31
2.4. Öneriler.....	31
3. 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	32
4. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	3333

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri	3
Tablo 2: Üniversitenin Kullanımında Olan ve Mülkiyet Durumuna Göre Fiziki Alanları (m2).....	5
Tablo 3: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL).....	7
Tablo 4: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme Projesinde Yapılan İşler	8
Tablo 5: Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı	9
Tablo 6: Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinde Yapılan İşler	11
Tablo 7: Kampüs Altyapısı Projesinde Yapılan İşler	16
Tablo 8: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan İşler.....	19
Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu.....	20
Tablo 10: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	21
Tablo 11: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	21
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Harcama Tablosu	22
Tablo 13: Makine - Teçhizat Alımları (TL)	22
Tablo 14: Muhtelif İşler Projesi – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kapsamında Yapılan İşler	24
Tablo 15: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	25
Tablo 16: Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler	26
Tablo 17: Büyük Onarım Projesi Tamamlanma Raporu	28
Tablo 18: Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi Kapsamında Yapılan İşler.....	29
Tablo 19: Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi Projesi Kapsamında Yapılan İşler.....	30



SUNUŞ

Üniversitemiz, 1882 yılında Mekteb-i Sanâyi-i Nefise-i Şâhâne adıyla kurulmuş; 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını almıştır. Ülkemizin ilk yükseköğretim kurumu olarak mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım alanlarında öncü rolünü günümüze kadar devam ettirmiştir.

Üniversitemiz, köklü birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla, bünyesindeki dört fakülte, üç yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, konservatuvar ve lisansüstü eğitim enstitüsünde çağın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli öğretim programlarını sürdürmektedir.

Güzel sanatlar alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan Üniversitemiz, temelleri 1910'larda atılan ve 1937 yılında Atatürk tarafından Akademi'ye tahsis edilen ülkemizin en büyük resim ve heykel koleksiyonundan oluşan bir Müze'ye sahiptir. Dolmabahçe Veliaht dairesinde faaliyete geçen İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 2009 yılında başlayan restorasyon ve taşınma süreçlerinin ardından 2021 yılı itibarıyla koleksiyonundaki eserleri sanatseverlerle tekrar buluşturmuştur.

Konservatuvarımızın sanat alanındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Dolmabahçe Sarayı'nın müstemilatı olarak uzun yıllar Askeriye tarafından kullanılan binaların 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Üniversitemize tahsis edilmesi Üniversitemizin önemli kazanımlarından birisidir.

Yenilikçi bir yaklaşımla, çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlayan Üniversitemizin Beşiktaş Yerleşkesi'ndeki Sürekli Eğitim Merkezinde ve Dolmabahçe'deki Konservatuvarımızda sürdürülen yarı zamanlı programlarla ihtisas alanlarımıza yönelik eğitimler toplumun her kesimine ulaşmaktadır.

Üniversitemizin kaynaklarını artırmak, verimli ve etkin kullanmak konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarımız devam edecektir. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 2005 yılında yürürlüğe konulan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” da kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmekte, saydamlık ve hesap verebilirliği temel ilke olarak kabul etmektedir. Buna göre kaynakların kullanımını denetlemek için çeşitli raporlamalar yapılması ilgili kanunla hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 25. maddesine göre hazırlanan, Üniversitemizin “2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda çalışan, katkı sunan, emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU
Rektör

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2025 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alır.

Üniversitemiz, 1882'de Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane adıyla kurulmuş ve müdürlüğüne arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey getirilmiştir. Resim, heykel, mimarlık ve hakkaklık alanlarında eğitim-öğretim yapması planlanan okulda 2 Mart 1883 tarihinde derslere başlamıştır.

Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksekokulu olan Kurum, 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını almış ve böylece Ülkemizde Akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuşmuştur. 4.11.1981'de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982'de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını almış, 2004 yılında ise adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak düzenlenmiştir.

1882 yılına dayanan köklü geçmişi ile ülkemizin sanat alanında ilk eğitim-öğretim kurumu olan Üniversitemiz Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinde öncü kadroları yetiştirdiği gibi, günümüzde de bünyesindeki üç fakülte, üç enstitü, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu ve İstanbul Devlet Konservatuarı ile eğitim-öğretim programları yürütmeyi sürdürmektedir. Ayrıca Üniversitemizde 2022 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu (26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı Resmî Gazete) ve 2023 yılında İletişim Fakültesi (04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmî Gazete) kurulmuştur.

Üniversitemizin bünyesinde ayrıca, ülkemizin en büyük sanat eseri koleksiyonu bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Türk sinemasının en geniş film arşivi de yer almaktadır. Üniversitemiz sanat, mimari, tasarım alanlarındaki ihtisaslaşmasına bağlı olarak ülkemizin gerek yetiştirdiği öğrenciler gerek akademik kadrosunun üretimleriyle kültür ortamını beslemeye ve geliştirmeye devam etmektedir.

Üniversitemizin vizyonu, köklü birikimini sanat, mimarlık, tasarım ve kültür alanlarında yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla geleceğe taşıyan üniversite olmaktır.

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 190.000.000 TL tutarında olmak üzere toplam 1.761.626.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri

Sıra No	Sektör / Alt Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	Proje Bedeli (TL)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)
1	Eğitim / Yükseköğretim	2025H03-259224	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.717.340	2.500.000
2	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-212546	Büyük Onarım	57.168.459	34.000.000
3	Eğitim / Yükseköğretim	2024H03-232625	Kampüs Altyapısı	20.000.000	14.000.000
4	Eğitim / Yükseköğretim	2025H03-259222	Yayın Alımı	2.525.000	2.500.000
5	Eğitim / Yükseköğretim	2025H03-259279	Muhtelif İşler	32.675.000	30.000.000
6	Eğitim / Yükseköğretim	2023H03-192309	Fındıklı Ek Eğitim Binası	49.688.505	1.000.000
7	Eğitim / Yükseköğretim	2025H03-259560	Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi	607.500.000	6.000.000
8	Eğitim / Kültür	2020H04-160840	Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı	172.518.750	15.000.000
9	Eğitim / Kültür	2011H04-1428	Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	41.168.000	11.000.000
10	Eğitim / Kültür	2022H04-187892	Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	230.456.000	35.000.000
11	Eğitim / Kültür	2023H04-196672	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	66.225.032	23.000.000
12	Eğitim / Kültür	2023H04-193161	Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	29.352.000	6.000.000
13	Eğitim / Kültür	2024H04-234804	Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları	15.600.000	10.000.000
GENEL TOPLAM				1.327.594.086	190.000.000

2025 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen 83.013.680 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilerek toplam sermaye giderleri ödeneği 273.013.680 TL tutarına ulaşmıştır. Toplam ödenekten 116.616.186 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz,

- Fen-Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- İstanbul Devlet Konservatuvarı
- Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Meslek Yüksek Okulu
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüleri birleştirilerek Lisansüstü Eğitim Enstitüsü oluşturulmuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Üniversitemizde dil eğitimini geliştirmek ve uluslararasılaşmak politikamıza bağlı olarak bazı programlarımızı yabancı dille de sürdürebilmek amacıyla 2022 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur (26.07.2022 tarih 31904 sayılı Resmî Gazete).

Üniversitemizde görsel tasarımda dijital dönüşümün desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2023 yılında İletişim Fakültesi kurulmuştur (04.08.2023 tarihli ve 32269 sayılı Resmî Gazete).

Bu programlar üniversitenin ihtisas alanı doğrultusunda kurulmuş 20 adet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan araştırma faaliyetleri ile desteklenmekte ve geliştirilmektedir.

Bunun yanı sıra İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezinde sadece öğretim elemanlarımızın değil, Ülkemizin sanatçılarına da destek olunmakta ve eserlerini sergileme imkânları sağlanmaktadır.



Fındıklı - Merkez Kampüs

Tablo 2: Üniversitenin Kullanımında Olan ve Mülkiyet Durumuna Göre Fiziki Alanları (m2)


Sıra	Birim	Belediye	Taban Alanı (m²)	Toplam Kapalı Alan (m²)	Mülkiyet ve Tahsis Şekli	Kullanım Amacı	İdari Alanlar (m²)	Öğretim Alanları (m²)	Sosyal Alanlar (m²)		Spor Alanları (m²)	
								Derslik – Laboratuvar-Salon	Kantin/ Yemekhane	Yurt	Açık	Kapalı
1	Fındıklı Yerleşkesi (Cemile Sultan Sarayı)	Beyoğlu	2.530	8.100	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	500	7.600	-	-	-	-
2	Fotoğraf Bölümü Binası	Beyoğlu	209	866	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	-	866	-	-	-	-
3	Heykel Ana Sanat Dalı Binası	Beyoğlu	900	1.108	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	180	928	-	-	-	-
4	Selamlık (Rektörlük Binası)	Beyoğlu	491	943	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	943	-	-	-	-	-
5	Akademi Kütüphanesi- Kantin-Öğrenci Yemekhanesi	Beyoğlu	950	1.450	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-Sosyal	-	875	575	-	-	-
6	Fındıklı Yerleşkesi (Münire Sultan Sarayı)	Beyoğlu	2.530	8.600	Milli Emlak	Öğretim	300	8.000	300	-	150	-
7	Yemekhane	Beyoğlu	871	871	Milli Emlak	Sosyal	-	-	871	-	-	-
8	Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu	Beyoğlu	642	642	Milli Emlak	Öğretim-Kültür	-	642	-	-	-	-
9	Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi	Beyoğlu	180	360	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Öğretim-Kültür	180	180	-	-	-	-
10	Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Binası	Beyoğlu	176	1.496	MSGSÜ	Öğretim-Kültür	374	1.122	-	-	-	-
11	Fındıklı Ek Hizmet Binası	Beyoğlu	123	1.000	MSGSÜ	Öğretim-İdari	1.000	-	-	-	-	-
12	Tophane Kasrı (Nusretiye Kasrı)	Beyoğlu	172	344	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	150	194	-	-	-	-
13	Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi	Beyoğlu	1.855	1.855	Milli Emlak	Kültür	100	1.755	-	-	-	-
14	Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası	Beyoğlu	40	200	Milli Emlak	Öğretim-Kültür	-	200	-	-	-	-
15	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	Beyoğlu	4.470	28.685	T.D.İ.	Kültür	2.000	24.685	2.000	-	-	-
16	Süheyl Bey Camii Alt Katı (Kitap Satış)	Beyoğlu	40	40	Vakıflar Genel Müdürlüğü	Öğretim-Kültür	40	-	-	-	-	-
17	Beşiktaş Yerleşkesi	Beşiktaş	870	4.350	MSGSÜ	Öğretim-Kültür	1.895	2.305	150	-	-	-
18	Balmumcu Yerleşkesi	Beşiktaş	4.000	9.710	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	600	8.800	310	-	-	-
19	Dolmabahçe Yerleşkesi	Beşiktaş	4.052	6.357	Milli Emlak	Öğretim-Kültür-İdari	632	5.349	376	-	-	-
20	Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu	Beşiktaş	970	4.500	Milli Emlak	Sosyal	470	1.765	500	-	-	-
21	Bomonti Yerleşkesi	Şişli	2.764	54.000	MSGSÜ	Öğretim-Kültür-İdari	13.320	39.780	1.400	-	-	500
22	Rektörlük Araştırma ve Uygulama Merkezi	Sarıyer	743	1.009	Milli Emlak	Uygulamalı Öğretim-Sosyal	-	609	250	-	-	-
23	Birgi Sandıkoğlu Konağı	İzmir/Birgi	170	340	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Uygulamalı Öğretim-Sosyal	70	-	-	-	-	-
24	Divriği (Yaz Okulu)	Sivas/Divriği	-	-	Divriği Kaymakamlığı	Uygulamalı Öğretim-Sosyal	-	-	-	-	-	-
25	Avşa (Yaz Okulu)	Balıkesir	1.167	-	MSGSÜ	Uygulamalı Öğretim-Sosyal	-	-	-	-	-	-
26	Marmara Adası (Yaz Okulu)	Balıkesir	22.340	-	MSGSÜ	Uygulamalı Öğretim-Sosyal	-	-	-	-	-	-
27	Büyükdada (Sergi Mekânı)	İstanbul	-	70	MSGSÜ	Sosyal	70	-	-	-	-	-
TOPLAM ALAN			53.255	136.896			22.824	105.655	6.732	-	150	500

1.3. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite- Kalite Artışı / İyileşme

Ülkemizin sanat, mimarlık ve kültür alanlarında yükseköğretim yürüten ilk ve en köklü kurumu olarak bu alanlarda en çok tercih edilen üniversitelerin başında gelen üniversitemizde her yıl artış gösteren öğrenci sayısına bağlı olarak derslik, atölye, sergi alanları, çalışma odası ve benzeri ihtiyaçlar da artmaktadır.

Mevcut binalarımızın ülkemizin deprem riskine göre güçlendirilmesi ise 2025 Yılı Yatırım Programında da başlıca hedeflerimizden biri olmuştur. Bu nedenle 2025 yatırım projeleri kapsamında üniversitemizin kullanımında olan fiziki alanların depreme dayanıklı hale getirilmesi için güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu açıdan özellikle 2023 yılında Yatırım Programına alınan Fındıklı Ek Eğitim Binası projesi ile deprem dayanımının yetersiz olduğu raporlanan bina yıkılmış ve 2025 yılında yapımı tamamlanmıştır.

Aynı şekilde deprem riski raporlanan Balmumcu Yerleşkesinde de bu kapsamda bir çalışma başlatılacağı için bu alanda bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Ulusal Türk Film Arşivi'nin muhafazası amacıyla arşiv bünyesinde bulunan nitrat tabanlı eserlerin taşınma iş ve işlemleri 2025 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Üniversitemiz işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

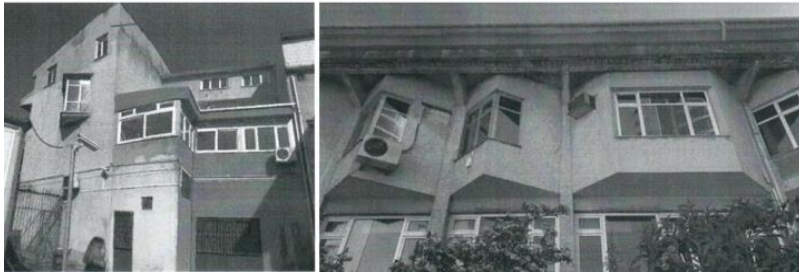

Balmumcu Yerleşkesi

1.4. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

2025 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen 83.013.680 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile toplam sermaye giderleri ödeneği 273.013.680 TL tutarına ulaşmıştır. Toplam ödenekten 116.616.186 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre yaklaşık %61,37 toplam ödeneğe göre %42,71 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 3: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	Kurum İçi Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.500.000	217.340		2.717.340	1.566.000
Büyük Onarım	34.000.000	668.459		34.668.459	34.561.262
Kampüs Altyapısı	14.000.000	-		14.000.000	9.053.197
Yayın Alımı	2.500.000	-	+25.000	2.525.000	2.521.039
Muhtelif İşler	30.000.000	2.700.000	-25.000	32.675.000	23.897.765
Fındıklı Ek Eğitim Binası	1.000.000	688.505		1.688.505	1.346.363
Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi	6.000.000	55.000.000		61.000.000	8.160.000
Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı	15.000.000	17.739.376		32.739.376	5.243.108
Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	11.000.000	-		11.000.000	3.005.300
Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	35.000.000	-		35.000.000	4.968.949
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	23.000.000	-		23.000.000	11.379.142
Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	6.000.000	6.000.000		12.000.000	10.270.862
Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları	10.000.000	-		10.000.000	643.200
Toplam	190.000.000	83.013.680	0	273.013.680	116.616.186

2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2011 H 04 – 1428 Tophane-i Amire Binası Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 41.168.000 TL, 2025 yılı program yılı ödeneği ise 11.000.000 TL'dir.

Projeden 3.005.300 TL tutarında harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı %49, nakdi gerçekleşme oranı %27'dir.

Tablo 4: Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenlemesi Projesinde Yapılan İşler

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenleme Projesi
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Kurulması İşİ
Tophane Kasrı Onarım İşleri
Tophane-i Amire Binasında Çeşitli Demir İşleri ve İnşaat Onarım İşleri Yapılması İşİ
Tophane-i Amire Okuma Bahçesinin Bakım Onarım İşleri
Tophane-i Amire Binasında Tesisat ve İnşaat İşleri Yapılması İşİ





Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Çevre Düzenlemesi Projesinden Çalışmalar

2.1.2. 2020 H 04 – 160840 Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı

2025 Yılı Yatırım Programında Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı adı ile yer alan projenin toplam proje bedeli 172.518.750 TL, 2025 yılı program yılı ödeneği ise 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.


Projeye 17.739.376 TL likit karşılığı ödenek kaydı eklenmiştir. Böylece program yılı ödeneği 32.739.376 TL olmuştur. Nakdi gerçekleşme oranı %16, fiziki gerçekleşme oranı ise %67'dir.

Proje kapsamında; Fındıklı Merkez Kampüsünü oluşturan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesinde çeşitli işler gerçekleştirilmiş olup 2025 yılında başlayan MSGSÜ Fındıklı Merkez Kampüsü Fotoğraf Binası Güçlendirme İş'i'nin 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

2025 Yılı Yatırım Programı ile Mimarlık Fakültesi Binası Güçlendirme ve Restorasyonu Projesi'nin ismi değiştirilerek Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı olmuştur.

Tablo 5: Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı Projesinde Yapılan İşler

Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı Projesi
MSGSÜ Dolmabahçe ve Fındıklı Kampüslerinde Çeşitli Tadilat ve Onarım İşleri
MSGSÜ Restorasyon Bölümü Doğrama ve Ahşap İşleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi (Cemile Sultan Sarayı) Çatısında Muhtelif Onarım İşleri
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Çatı ve Pencerelerinin Değişim ve Onarım İş'i
MSGSÜ Fındıklı Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Boya ve Çeşitli İnşaat İşleri Yapılması İş'i
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Binasında 2 Adet Yangın Merdiveni İmalatı Yapılabilmesi İçin Statik Proje ve İlave Dokümanlar Hazırlanması İş'i
MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (Cemile Sultan Sarayı) Ahşap Doğrama İşleri
MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Binasının Rölöve Hizmeti Alım İş'i
MSGSÜ Mimarlık Fakültesinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı

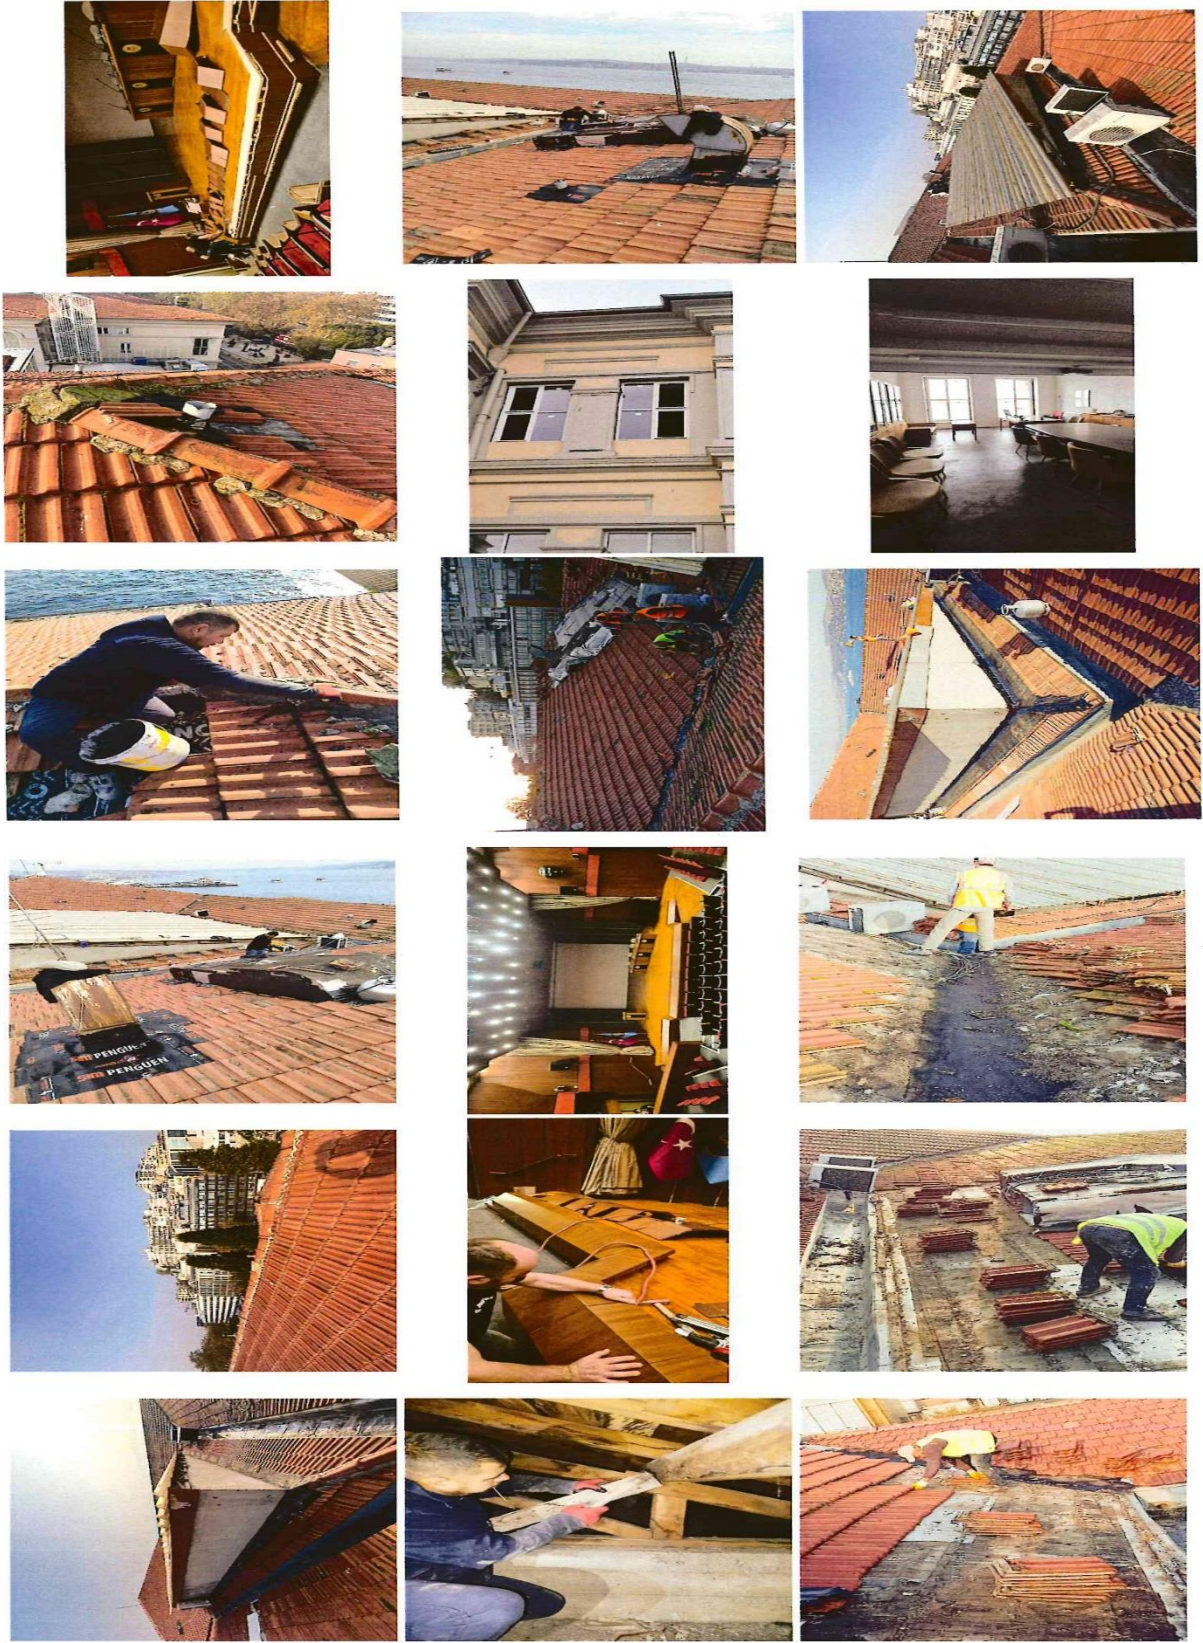

Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı Projesinden Çalışmalar

2.1.3. 2022 H 04 – 187892 Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 230.456.000 TL, 2025 yılı program yılı ödeneği ise 35.000.000 TL olan Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu projesinden 4.968.949 TL tutarında harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleştirme oranı %17, nakdi gerçekleştirme oranı %14'tür.

Üniversitemize 2021 yılında tahsis edilen Dolmabahçe Yerleşkesinde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz döneminden itibaren İstanbul Devlet Konservatuvarı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Tablo 6: Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinde Yapılan İşler

Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu
Dolmabahçe Yerleşkesi Çeşitli Tadilat ve Onarım İşleri
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Kurulması İşİ
Dolmabahçe Yerleşkesi C Blok ve Muhtelif Yerlerde Çeşitli Onarım İşleri
Dolmabahçe Yerleşkesi C Blok Binası Kamera ve Ağ Altyapısı İşleri
Dolmabahçe Yerleşkesinde Bulunan Ağaçlara Ait Ağaç Rölöve Planı Dosya Tanzim İşİ



Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu Projesinden Çalışmalar

2.1.4. 2023 H 04 – 196672 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi

2023-2027 yıllarını kapsayan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Projesi, Türk Resim Sanatının Bilimsel Analizi: Asker Ressamlar ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Tadilat İşleri adlı iki alt projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı 66.225.032 TL ve program yılı proje ödeneği 23.000.000 TL olan projeden toplam 11.379.142 TL harcanmıştır.

a) 2025 H 04 – 196672 – 35804 Türk Resim Sanatının Bilimsel Analizi: Asker Ressamlar

Söz konusu projenin 2025-2026-2027 yıllarında gerçekleştirilmesi öngörülmüş olup 2025 yılı için ayrılan 5.000.000 TL ödenek için nakdi gerçekleştirme oranı %86, fiziki gerçekleştirme oranı ise %60'tır.


Alt projeden 4.338.720 TL harcanmıştır.



Hiperspektral Görüntüleme (HSI)

Sanat eserlerinin korunması ve analizinde yeni bir yaklaşım sunan hiperspektral görüntüleme (HSI), spektroskopi ile dijital fotoğrafçılığı birleştirerek eserlerin "tahribatsız" bir şekilde incelenmesine katkı sunmaktadır. İnsan gözünün algıladığı görünür ışıkla sınırlı kalmayan bu teknoloji, ultraviyole (UV) ışınlarından kızılötesine (SWIR) uzanan geniş bir elektromanyetik spektrumda tarama yaparak eserin her bir pikseli için ayrı bir spektral imza oluşturmaktadır.

Kısa dalga kızılötesi (SWIR) bantları sayesinde boya tabakalarının altına nüfuz edilerek, sanatçının eseri oluştururken kullandığı hazırlık çizimleri ve kompozisyon değişikliklerinin gün yüzüne çıkarılmasına da katkı sunan tahribatsız bir yöntemdir. Aynı zamanda, çıplak gözle kusursuz görünen restorasyon müdahaleleri, rötuşlar ve yamalar, farklı spektral tepkiler sayesinde tespit edilerek eserin özgünlük durumunun netleştirilmesine de önemli katkı sunmaktadır. Nem, tuzlanma veya biyolojik bozulma gibi fiziksel hasarların erken evrede teşhis edilmesine de olanak tanıyan bu sistem gelecekteki koruma ve izleme süreçleri için hassas bir referans noktası oluşturmaktadır.

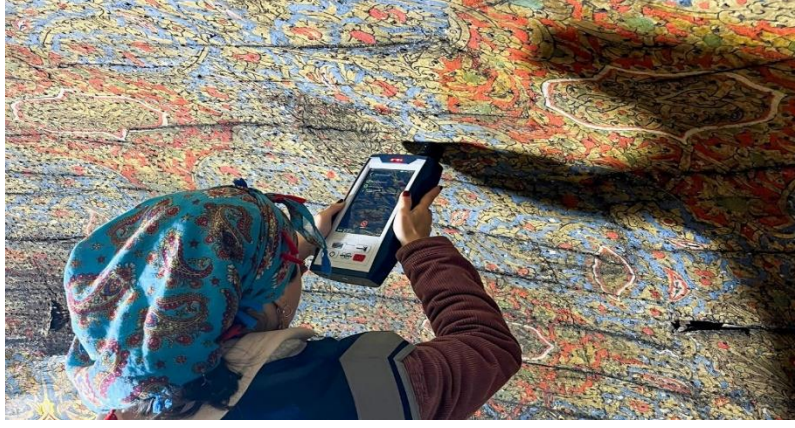

Raman Spektroskopisi Arkeometri

Son yıllarda, Raman spektroskopisi arkeometri, sanat analizi ve koruma bilimi alanlarında yerleşik bir analitik teknik haline gelmiştir. Mobil Raman cihazları, sanat ve arkeometri alanlarında inorganik ve organik malzemelerin yerinde karakterizasyonu ve tanımlanması için tasarlanmıştır.

Araştırmalarda genellikle değerli ve kırılgan eserler incelendiğinden, esere zarar verme riskini en aza indiren ancak aynı zamanda elde edilen bilgiyi maksimize eden cihazlara ihtiyaç duyulur. Mobil Raman cihazları, eserlerin laboratuvara taşınmasına gerek kalmadan, sanat eserlerini doğrudan yerinde incelemek için geliştirilmiştir. Fiber optik prob başlıkları, resimlerin pigmentlerini incelemek için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Kültür varlıklarının analizine özgü ihtiyaçları karşılamak üzere özel cihazlar geliştirilmiştir ve bu ilk cihazlar, müze, arkeolojik alanlar gibi birçok farklı koşulda, genellikle XRF gibi tamamlayıcı tekniklerle birlikte kullanılmıştır. Detaylı bir cihaz kurulumu gerektirmeyen el tipi cihazlar sayesinde müzelerde sergilenen eserleri müzenin işleyişini bozmadan, kısa sürelerde incelemek mümkün olmaktadır.

Yukarıda bahsedilen cihazların proje kapsamında kurum altyapısına kazandırılması sayesinde taşınabilir kültür varlıklarının tahribatsız analizi konusunda önemli bir kapasite artışı sağlanmıştır.

Bu süreçte projenin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik altyapıyı güçlendirme işlemleri ve personel eğitimleri gibi hususlar gerçekleştirilmiş, projenin paydaşı ve eserlerin ev sahibi olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı ile çalışma planları hazırlanmış ve proje kapsamında çalışılacak eserler seçilerek tespit ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır. Projenin 2026 yılında planladığı şekilde devam etmesi ön görülmektedir.



Proje Kapsamında Çalışılacak Eserlerden Örnekler

b) 2025 H 04 – 196672 – 20690 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Tadilat İşleri

2025H04-196672 – 20690 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Tadilat İşleri alt proje kapsamında Müzemize tahsis edilen ödenekler ile mevcut sanat eserlerinin muhafaza edilmesi ve korunmasıyla birlikte müzemizin faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. 2025 yılı Yatırım Programı ile başlayan projenin başlangıç ödeneği ve program yılı ödeneği 18.000.000 TL'dir.

2023H04-196672 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Faaliyetleri Projesinin alt projesi olan 20690- İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Tadilat İşleri projesi kapsamında; 06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.124.800,00 TL, 06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 3.037.380,00 TL, 06.01 Mamul Mal Alımları 1.878.241,00 TL olmak üzere toplamda 7.040.421,00 TL harcama yapılmıştır.

Alt proje kapsamında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi bünyesinde bulunan 10 adet asansör, 2 adet 800 kVA jeneratör, merkezi UPS, yangın alarm sistemi, fancoil üniteleri, havalandırma sistemi gibi teknik cihazların bakımları ile kullanım ömürlerinin uzatılması ve verimli çalışmaları ve mezkûr teknik cihazların bakım-onarımları başta olmak üzere mamul mal alımları ve tadilat işleri (Müze Akademi, Akademi Sinema Salonu) gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Müzemizde bulunan soğutma sistemlerinin, yangın söndürme sistemlerinin, asansör, jeneratör gibi teknik cihazların daha verimli ve uzun ömürlü çalışabilmesi açısından bakımları belirli periyodik aralıklarla yapılmıştır.





İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Tadilat İşleri

2.1.5. 2024 H 03- 232625 Kampüs Altyapısı Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 20.000.000 TL, 2025 yılı program yılı ödeneği ise 14.000.000 TL olan Kampüs Altyapısı projesinden 9.053.197 TL harcanmıştır.

2024-2026 yıllarını kapsayan projenin fiziki gerçekleşme oranı %88 ve nakdi gerçekleşme oranı %65 olarak hesaplanmıştır.

Üniversitemizin tüm binalarında eğitim öğretimin, sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların altyapılarını düzenlemek amacıyla aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

Tablo 7: Kampüs Altyapısı Projesinde Yapılan İşler

Kampüs Altyapısı
MSGSÜ Bomonti, Dolmabahçe, Fındıklı, Beşiktaş, İRHM Yerleşkelerinde Muhtelif Tesisat, Elektrik ve İnşaat İşleri Yapılması İş
Dolmabahçe Yerleşkesi Kazan Dairesi Elektrik Pano Değişim İş
MSGSÜ Bomonti Kampüs Binası Sıcak Su ve Soğuk Su Hattı Tesisat Boru Yenileme İşleri
MSGSÜ Kilyos Yerleşkesinde Bulunan Adp-Kompanzasyon ve Üst Bungalov Dağıtım Panosu Yenilenmesi, Çevre Aydınlatma Hattı ile Bungalovlara Kaçak Akım Rôle Montajı İşleri Yapılması İş
Fındıklı Merkez Santral Lisansı ve Sinema TV Bölümü Geçici Dersliğinde Telefon Baz Sistemi Kurulması İş
MSGSÜ Binalarında Kompanzasyon Sistemlerinin Onarım İşleri
Fındıklı Kazan Dairesinde Yeni Elektrik Pano Yapılması ve Sigorta Kutusu Tadilatı İş
Bomonti Yerleşkesi Isıtma Sistemi Fancoil Bakımları Elektrik ve Tesisat İşleri Yapılması İş
MSGSÜ Ek Hizmet Binasında Elektrik Proje Revizyonu ile Ana Elektrik Bağlantı İşleri
Bomonti Binası Bakım Onarım Kapsamında Yangın Alarm Sistemine İlave Dedektörler İş
Fındıklı Kampüsü Kombine ile Kanalizasyon Hatları ve Rögarlarının, Çekilmesi ve Onarım İş
Fındıklı Yerleşkesi 20 Litre Kaçak Kimyasal Uygulama İşlemi

2.1.6. 2024 H 04 – 234804 Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları

Ulusal Film Arşivi projesi ile ülkemizin en büyük sinema arşivine sahip olan kurumumuzun, arşiv olanaklarının geliştirilerek ARGE temelli Ulusal Film Arşivi'ne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, 1940-2000 yılları arasında çekilen Türk filmlerinin teknik açıdan incelenmesi, raporlanması, onarılması ve gerektiğinde acil dijital kayıtlarının yapılması planlanmıştır. Ayrıca, bu filmlerin uluslararası film arşivlerinde korunması ve saklanması için yeni imkanların geliştirilmesine odaklanan ARGE çalışmaları yürütülmektedir. Elde edilen sonuçlar, Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu (FIAF) ile paylaşılacak ve uluslararası sempozyumlarda sunulacaktır.


2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli ve 2025 yılı program yılı ödeneği 10.000.000 TL olan Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları projesinden 643.200 TL harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 6'dır.



Veri Yedekleme, Depolama Cihazları ve Diskleri



8 mm ve Super-8 mm Film Okuma Kafası

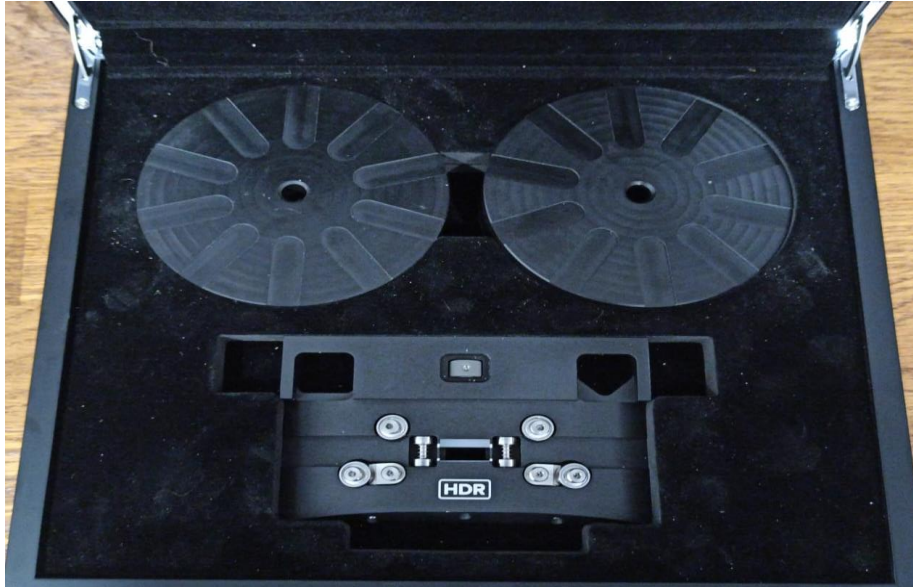

8 mm ve Super-8 mm Film Okuma Kafası

2.1.7. 2025 H 03 – 259560 Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi

Üniversitemiz Balmumcu Yerleşkesi binalarında İSTON tarafından yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda, tüm blokların deprem dayanımının yetersiz olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu alanda yeni bir yapı oluşturulması için etüt proje işlerinin, yatırım projesi kapsamında yapılabilmesi için Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi 2022 Yılında Yatırım Programına alınmıştır. 2022 yılında Balmumcu Yerleşkesi İnşaatı Etüt Projesi adıyla Kültür alt sektöründe yer alan projede 2025 yılına gelindiğinde sektör değişikliğine gidilmiş ve projenin Yükseköğretim alt sektörüne geçirilmesine karar verilmiştir. Proje 2025 Yılı Yatırım Programında “Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi” adıyla yer almıştır.

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 607.500.000 TL, 2025 yılı program yılı ödeneği ise 6.000.000 TL olan Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi projesine 2024 yılından kalan likit ödeneği için talep oluşturulmuş ve talebin uygun bulunması ile projeye 55.000.000 TL likit eklenmiştir.

Bütçe uygulamaları sonucunda 61.000.000 TL’ye ulaşan projeden 2025 yılında 8.160.000 TL harcanmıştır. Nakdi gerçekleştirme oranı %13’tür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde bulunan nitrat tabanlı filmlerin taşınabilmesi için tahsisi yapılan mekânın iklimlendirme, yangın önleme gibi gerekli donanım ve altyapı işlemlerine yönelik ihale işlemi yapılmış ve ilgili süreç 2025 yılında tamamlanarak taşıma işlemleri sonlandırılmıştır.

2025 yılının sonuna gelindiğinde Balmumcu Yerleşkesinde bulunan binaların yıkımı başlamıştır. 2026 Yılı Yatırım Programı ile Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi inşaatı projesinin ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanacaktır.





Nitrat Tabanlı Film Arşivi (Ankara)

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2025 H 03- 259224 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında program yılı ödeneği 2.500.000 TL olan projeye 217.340 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Böylece projenin toplam tutarı 2.717.340 TL olmuştur. Projeden 1.566.000 TL harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %58'dir.

Bu projede Üniversitemizin yatırım programında yer alan ve planlanan işler için etüt-proje hizmetleri yürütülmüştür.

Tablo 8:Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Muhtelif Yerleşkelerde Acil Durum Tahliye Planlarının Çizimi ve Montajı Yapılması İşİ
Fındıklı, Bomonti ve Müze Binalarında 2025 Yılı Enerji Yöneticiliği Hizmeti Alım İşİ
Tophane-i Amire Cephe Aydınlatma Projelendirme İşİ
Fotoğraf Bölümü Binası Deprem Performans Analizi Yapılması İşİ
Binalarda Topraklama ve Paratoner Periyodik Ölçümleri Yapılması ve Raporlanması İşİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Binasının Yangın Algılama Sistemi, Acil Anons Sitemi ve Kablo Tava Sisteminin Proje Çizim İşİ

Tablo 9: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2025 H 03 - 259224			2025 H 03 - 259224		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025- 31/12/2025			01/01/2025- 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		2.500			2.717	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla*</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		1.566			1.566	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemizin devam eden ve yapılması planlanan yatırımları için yapılan etüt-proje çalışmaları ile önümüzdeki yıllar için altyapı oluşturulmuştur.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Onarım işlerinde maliyetin tam olarak belirlenebilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır.					

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025 =1)

2.2.2. 2025 H 03- 259222 Yayın Alımı Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında program yılı ödeneği 2.500.000 TL olan Yayın Alımı Projesine Üniversitemiz diğer yatırım projesinden 25.000 TL kurum içi aktarma yoluyla ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece projenin toplam tutarı 2.525.000 TL olmuştur. Projenin dönem sonuna kadar harcama toplamı 2.521.039 TL'dir.

2025 yılı içerisinde kütüphanelerimizde basılı kitap/tez/kitap dışı materyal/sürelî yayın sayısı: 163.488 adet, elektronik kitap&dergi sayısı: 420.992 adet, abone olunan veri tabanı sayısı 13, EKUAL kapsamında abone olunan veri tabanı sayısı ise 44 adettir. Kütüphane kataloğu aracılığıyla kullanıcılar tüm kütüphane kaynaklarının bibliyografik bilgilerine ve elektronik kaynaklara (veri tabanları) tam metin erişimi sağlayabilmektedir. Ayrıca; Kampüs dışından e-kütüphane portalımız (<http://ekutuphane.msgsu.edu.tr>) aracılığıyla da elektronik kaynaklara erişim imkânı sunulmaktadır.



Fındıklı Akademi Kütüphanesi

Tablo 10:Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutarı (TL)
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	0
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2.521.039
Toplam	2.521,039

Tablo 11:Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-259222			2025H03-259222		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Basılı ve Elektronik Yayın Alımları			Basılı ve Elektronik Yayın Alımları		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		2.500			2.525	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		2.521			2.521	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projedeki abone olunan veritabanları ile üniversite mensubu öğretim üyesi ve öğrencilerine yönelik olarak akademik bilgi hizmeti sağlamaktadır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Abonelik sağlanan veri tabanlarına ilişkin ödemelerin döviz cinsinden olması nedeniyle kurda meydana gelen dalgalanmalar maliyet riski oluşturmaktadır.					

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025 =1)

2.2.3. 2025 H 03 - 259279 Muhtelif İşler Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli ve program yılı ödeneği 30.000.000 TL olan Muhtelif İşler Projesi; Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış bir projedir.

Projeye kesin hesap işlemleri için 2.700.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca Yayın Alımı projesine 25.000 TL projeler arası aktarma işlemi nedeniyle düşme gerçekleştirilmiştir.

Bütçe uygulamaları sonucunda toplam ödeneği 32.675.000 TL'ye ulaşan projeden 23.897.765 TL tutarında harcama yapılmıştır. Toplam ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı %73'tür.

Tablo 12:Muhtelif İşler Projesi Harcama Tablosu

Ekonomik Kod	2025 Yılı Başlangıç Ödeneği	Projeler Arası Aktarım	Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	Proje İçi Ödenek Aktarımı	Toplam Ödenek	Harcama
06.1 Mamul Mal Alımları	23.170.000	-25.000		-500.000	22.645.000	16.372.432
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	5.829.000		-	-500.000	5.329.000	3.970.362
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım	1.000		2.700.000		2.701.000	2.679.413
06.9 Diğer Sermaye Giderleri	1.000.000		-	+1.000.000	2.000.000	875.558
TOPLAM	30.000.000	-25.000	2.700.000	-	32.675.000	23.897.765

Proje kapsamında gerçekleştirilen 06.1 Mamul Mal Alımlarının Makine-Teçhizat karakteristiği kapsamında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde detayı Tablo 13'te gösterilmiştir.

Tablo 13:Makine - Teçhizat Alımları (TL)

Makine - Teçhizat Alımları (TL)	
06.01.10 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	2.872.234,23
06.01.20 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	2.565.424,87
06.01.30 Avcılık Alımları	1.412.951,59
06.01.40 Taşıt Alımları	2.249.775,00
06.01.70 Kültür Varlığı Yapımları, Alımları ve Korunması Giderleri	11.820,00
06.01.80 Bilişim Donanım Alımları	7.260.226,41
TOPLAM	16.372.432,10

Projenin Makine-Teçhizat karakteristiği kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda Mimarlık Fakültesi tarafından cihaz alımı için 972.600 TL harcanmıştır. Bu kapsamda alınan analiz cihazlarıyla Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Laboratuvarı cihaz kapasitesinin artırılarak, mimarlık eğitiminde yapı malzemesi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerin uygulamalı olarak deneyim kazanmaları, döner sermaye kapsamında yapılacak işlerden Üniversiteye gelir artışı, mezun öğrencilerin yapı sektöründe aktif rol almasının sağlanması hedeflenmiştir.

Muhtelif İşler proje içi yapılan aktarımlarla Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Laboratuvarına, Elektronik Rezistograf ve Portable Lumber Grader Model Tahribatsız Analiz Cihazları alınmıştır.



Yapı Fiziği ve Malzeme Laboratuvarı Cihazları

Projenin Bilgi ve İletişim Teknolojileri karakteristiği kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik kodunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 8.286.418 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz Bomonti Yerleşkesi 5. Katta bulunan bilgisayar laboratuvarının eskiyen 30 adet bilgisayarları yenilenmiş, günümüz koşullarına uygun teknolojik alt yapıya sahip bir laboratuvar haline getirilmiştir. Ayrıca İletişim Fakültesi Dekanlığı bünyesinde kurulan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü için 20 adetlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Sinema Televizyon Bölümü için ise 25 adetlik güçlü konfigürasyonlara sahip bilgisayarlardan oluşan laboratuvarlar kurulmuş ve hizmete açılması sağlanmıştır.

Ulusal Film Arşivinin Geçici Mekanlara Taşınması İşİ kesin hesap hak edışı ödemesi için 2.700.000 TL likit karşılığı ödenek, Sinema ve Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ekonomik koduna kaydedilmiştir. Ayrıca projenin Bakım - Onarım karakteristiği kapsamında 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde başlangıç ödeneği 1.000 TL iz ödenek olarak bulunmakla birlikte toplam 2.679.413 TL harcanmıştır.

Üniversitemizin muhtelif birimlerinde ihtiyaç duyulan yazıcı tonerleri, 16 gb ram ve 2 tb harici diskler, bilgisayarlar, kameralar, çok fonksiyonlu lazer yazıcı alımları ve çeşitli bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.




Fen Edebiyat Fakültesi 5. Kat Laboratuvarı

Tablo 14: Muhtelif İşler Projesi – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kapsamında Yapılan İşler

Muhtelif İşler Projesi – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Antivirüs Yazılımının Lisans Güncelleme İşİ
Fiber Optik Ağ Alt Yapı İşİ
Üniversitemiz Bilgisayarlarında Kullanılmak Üzere Microsoft 365 Lisans Alımı İşİ
Öğrenci İşleri Otomasyonunda (OBS) Öğrenciye Not İlan Edildikten Sonra Not Değişikliği Yapılabilme Modülü Alımı İşİ
Sürekli İşçi (4/D) Maaş, Bordro, Toplu İş Sözleşmesi ve Özlük Yazılımı Lisans Güncelleme Alımı İşİ
Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinde Kullanılan Ek Ders Otomasyonu Lisans Güncelleme Alımı İşİ
Üniversitemiz Muhtelif Birimlerinde Kullanılan İlan ve Başvuru Otomasyonu Lisans Güncelleme Alımı İşİ
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında Kullanılan Personel Otomasyonu Lisans ve Güncelleme Alımı İşİ
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Revizyon ve Güncelleme İşİ
Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılım Lisans Güncelleme İşİ
Üniversitemiz İRHM Veri Depolama Cihazı Alımı İşİ
Kilyos Yerleşkesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi İnternet Alt Yapı Hizmeti İşİ
Başkanlığımız Veri Merkezinde Kullanılmakta Olan Ortam İzleme Yazılımı Lisans Güncelleme İşİ
Öğrenci Diplomalarının ve Eklerinin Elektronik İmza ile İmzalanabilmesi İçin Öğrenci Bilgi Sistemine E-imza Modülü Alınması İşİ
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Yazılımı Lisans Güncelleme İşİ
Üniversitemizin Muhtelif Birimlerinde Kullanılmak Üzere Adobe CC Lisans Alımı İşİ
ISO 27001:2022 BGYS Denetim ve Belgelendirme Hizmeti Alım İşİ
Üniversitemizin Bilişim Sistemlerinin Güvenlik Testlerinin (Sızma/Penetrasyon Testi) ve Doğrulamalarının (Kontrol Testi) Yapılması Hizmet Alımı İşİ
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde (İRHM) Kullanılmakta Olan Koleksiyon ve Arşiv Yönetim Sistemi Yıllık Lisans Güncelleme İşİ



Sinema Tv Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı (Ortaköy)

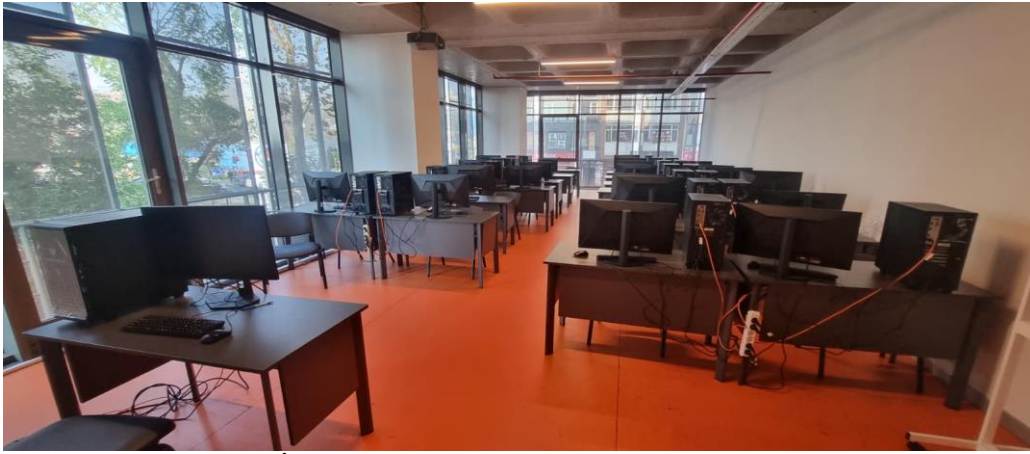

İletişim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı

Tablo 15:Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03 - 259279			2025H03 - 259279		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		30.000			32.675	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		23.898			23.898	

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025=1)

2.2.4. 2023 H 03 – 212546 Büyük Onarım

Üniversitemizin tüm binalarında eğitim-öğretimin sürekliliğini sağlamak ve fiziksel mekanların daha işlevsel hale gelmesi için ihtiyaç duyulan yenileme, onarım ve yapım imalatları bu proje ile gerçekleştirilmektedir.

2025 Yılı Yatırım Programında program yılı ödeneği 34.000.000 TL olan projeye 668.459 TL likit karşılığı ödenek talebi yapılmış ve eklenmiştir. Projenin toplam proje bedeli 2025 yılı için 34.668.459 TL olmuştur.

2023-2025 yıllarını kapsayan projeden 34.561.262 TL harcanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı % 99'dur.

Tablo 16: Büyük Onarım Projesinde Yapılan İşler

Büyük Onarım
MSGSÜ Oditoryum ve Tophane-i Amire'de Bulunan Klima Santrali ve Vrf Ünitelerinde Bakım-Onarım İşİ
Sinema ve TV Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Film Arşivi'ne Ait Vrf Klima Sistemlerinin Demontaj ve Montaj İşİ
Yerleşke ve Binalarda Bulunan 12 Adet Jeneratörün 7 Aylık Periyodik Bakım-Onarım ve Servis İşİ
MSGSÜ Muhtelif Birimlerinde Trafo Bakım-Onarım Hizmeti ile Topraklama ve Paratoner Periyodik Kontrol İşİ
Muhtelif Yerlerde Bulunan 12 Adet Asansörün 2025 Yılına Ait Kısmi Parçalı Bakım-Onarım ve Servis Hizmetleri İşİne Ait Hizmet Alım İşİ
Fındıklı Yerleşkesindeki Kazanların Parça Değişim ve Onarım İşİ
Fındıklı Merkez, Bomonti ve Tophane-i Amire Binalarında Klima Montaj, Demontaj ve Onarım İşleri
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi YG Hücre Havalandırma Tadilatı İşİ
Rektörlük Uygulama ve Araştırma Merkezi Trafo İşletme Topraklaması İşİ
Bomonti Yerleşkesinde Bulunan Taze Hava Klima Santrali ve İklimlendirme Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım İşİ
Bomonti Binası İdari Odalarda Hassas Klima Bakım-Onarım İşİ
Oditoryum Sahne Onarım İşİ
Sinema ve TV Bölümü Geçici Derslik Yapılması İşİ
İletişim Fakültesinde Muhtelif Yalıtım İşleri
Bomonti Yerleşkesinde Cam Cephe Doğramalarının Makas, Kol Değişimleri, Asansör Kuyusu Su İzolasyonu ile Çeşitli İnşaat ve Onarım İşleri Yapılması İşİ
MSGSÜ Birimlerinde Muhtelif Cam, Sineklik ve Tadilat İşleri
Bomonti Yerleşkesi Yemekhane İçinde Ofis ve B2 Katında Atölye Mahallinde Çeşitli Doğrama ve Cam İşlerinin Yapılması İşİ
Muhtelif Birimlerde Kullanılmak Üzere Bakım Onarım İşleri İçin Malzeme Alım İşİ
MSGSÜ Beşiktaş Binasında Kantin Yapılması İşİ
Fen-Edebiyat Fakültesi Binasında Dans ve Basketbol Sahası İçin Yükseltilmiş Parke Zemin Yapılması İşİ
Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Yüksekokulu İçin Derslik ve Atölye Yapılması İşİ
Bomonti B3 Katındaki Laboratuvarlara Tezgâh Yapılması İşİ



Büyük Onarım Projesinden Çalışmalar

Tablo 17: Büyük Onarım Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03 - 212546			2023H03 - 212546		
Proje Adı	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon			Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		34.000			34.689	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		34.561			34.561	

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025=1)

2.2.5. 2023 H 03 - 192309 Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi

Üniversitemize ait, Fındıklı bölgesinde yer alan binanın deprem dayanımının yetersiz olması sebebiyle yıkılarak tekrar inşa edilmesi gerektiği İSTON tarafından yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda belirlenmiştir. Bu çerçevede 2025 yılında 49.688.505 TL toplam proje bedeli ile Yatırım Programında yer alan Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesinde binanın yıkılarak yeniden yapılması öngörülmüştür.

2025 yılı sonu itibarıyla proje tamamlanmış ve kapatılmıştır.

2025 yılında 1.000.000 TL olan program yılı ödeneğine 688.505 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylece 2025 yılı toplam proje tutarı 1.688.505 TL olmuştur. Proje için 2025 yılında 1.346.363 TL harcanmıştır.



Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesinden Çalışmalar

Tablo 18: Fındıklı Ek Eğitim Binası Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03 - 192309			2023H03 - 192309		
Proje Adı	Fındıklı Ek Eğitim Binası			Fındıklı Ek Eğitim Binası		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Ek Hizmet Binası (1.000 m ²)			Ek Hizmet Binası (1.000 m ²)		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		1.000			1.689	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		1.346			1.346	

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025=1)

2.2.6. 2023 H 04 – 193161 Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi

2023 Yılı Yatırım Programı ile başlayan Sıbyan Mektebi Restorasyonu projesinin başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda 6.000.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiş olup program yılı ödeneği 12.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Projenin toplam maliyeti 29.352.000 TL'dir.

Üniversitemiz Merkez Kampüs içerisinde yer alan, tarihi “Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi” nin restorasyon proje çalışmaları tamamlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan gerekli onaylar alınmıştır. 2023 yılı içerisinde ihalesi tamamlanarak 2024 yılında çalışmaları başlayan restorasyon işleri 2025 yılında tamamlanmıştır.

2025 yılında projeden restorasyon projesi çalışmaları için 10.270.862 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 19: Sıbyan Mektebi Restorasyonu Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H04 - 193161			2023H04 - 193161		
Proje Adı	Sıbyan Mektebi Restorasyonu			Sıbyan Mektebi Restorasyonu		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Kültür			Eğitim / Kültür		
Proje Yeri	İstanbul			İstanbul		
Karakteristiği	Etüt-Proje, Restorasyon			Etüt-Proje, Restorasyon		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	2025	6.000			12.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla*		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		10.271			10.271	

*: 2025-2027 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi – Deflatör (2025=1)



Zevk-i Kadın Sıbyan Mektebi

SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

1.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Yeni ihale mevzuatının uygulamada yaşanan sorunların yanı sıra yaklaşık maliyet hesabının yapılmasında birtakım sorunlar yaşanmaktadır.
- Onarım işlerinde maliyetin tam olarak belirlenebilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
- İhale öncesi ve ihale anında katı, kapalı hatta ihale komisyonu işlemini zorlaştırıcı özellikler taşıyan yasa maddeleri esnekleştirilerek ihale komisyonuna güvence altında çalışma olanağı sağlanmalıdır.
- Üniversitemizin yatırım uygulamalarının büyük çoğunluğu şehir merkezinde olduğundan inşai faaliyetlerde aksamalara yol açmaktadır.
- Yatırım programlarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla paydaş kurumlardan alınması gereken sicil, izin, ruhsat vs. belgelerin temininde sorunlar yaşanmaktadır.

1.2. Öneriler

- Maliyet hesaplama metotlarının bir disiplin altına alınarak sistematik hale getirilmesi gereklidir.
- Onarım işlerinde genellikle başvuru alan yasa maddesi olan (22/d)'nin eşik değerinin sorunları çözecek düzeyde limitinin artırılması gereklidir.
- Personelin sürekli güncellenen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve EKAP ile ilgili eğitimlere katılımı sağlanmalıdır.

2. 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2025 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı Toplam	Geçmiş Yıllar Kümülatif Harcama	Program Yılı Ödeneği	+/-	Aktarma, Ekleme	Harcama
2025H03-259224	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2025	İstanbul	2.717	-	2.500	+	217	1.566
2023H03-212546	Büyük Onarım	Özel Bütçe	2025	İstanbul	57.168	22.500	34.000	+	668	34.561
2024H03-232625	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2026	İstanbul	20.000	2.700	14.000			9.053
2025H03-259222	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2025	İstanbul	2.525	-	2.500	+	25	2.521
2025H03-259279	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2025	İstanbul	32.675	-	30.000	+	2.675	23.898
2023H03-192309	Fındıklı Ek Eğitim Binası	Özel Bütçe	2025	İstanbul	49.689	48.000	1.000	+	689	1.346
2025H03-259560	Balmumcu Yerleşkesi Kültür Merkezi	Özel Bütçe	2027	İstanbul	607.500	-	6.000	+	55.000	8.160
2020H04-160840	Fındıklı Merkez Kampüsü Güçlendirme, Restorasyon ve Bakım-Onarımı	Özel Bütçe	2027	İstanbul	172.519	117.519	15.000	+	17.739	5.243
2011H04-1428	Tophane-i Amire Tarihi Kimlik ve Çevre Düzenleme Projesi Hazırlanması	Özel Bütçe	2027	İstanbul	41.168	7.668	11.000			3.005
2022H04-187892	Dolmabahçe Yerleşkesi Restorasyonu	Özel Bütçe	2027	İstanbul	230.456	40.237	35.000			4.969
2023H04-196672	İstanbul Resim ve Heykel Müzesi	Özel Bütçe	2027	İstanbul	66.225	8.225	23.000			11.379
2023H04-193161	Sıbyan Mektebi Restorasyonu İşİ	Özel Bütçe	2025	İstanbul	29.352	17.352	6.000	+	6.000	10.271
2024H04-234804	Ulusal Film Arşivi ARGE Çalışmaları	Özel Bütçe	2026	İstanbul	15.600	3.600	10.000			643
TOPLAM					1.327.594	267.801	190.000	+	83.013	116.616

3. 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	13	-	1.327.594	-	-	146.726	-	-	190.000	-	-	83.014	-	-	116.616
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
TOPLAM	13	-	1.327.594	-	-	146.726	-	-	190.000	-	-	83.014	-	-	116.616
